

364/130424/07

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : Appartement D3.1

Plaats van onderzoek : Buig ETIEME aansluiten aan 13/3,2 dekke

Eigendom van : De smelt De Mulder

Opdrachtgever : Vanderlaet

Installateur : Marc Technisch Loodkemanweg 122 3550 Heusden

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Carolens Datum van onderzoek : 23/04/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40 Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 40 Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : 2x1.5 aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengrondse net/ondergrondse op bovengrondse net/ondergrondse net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm² Spreidingswaarde : 1,44 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 22 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2 p 40 A 1300 mA bijkomende : 2 p 40 A 1300 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/04/2013 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder voortzetting wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

[Handtekening]

erkend controle organisme
 vereniging zonder winst oogmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10


www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

1) Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtstreeks of indirect te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.


1) ter kennis worden gebracht van het comitè voor Veiligheid, Gezondheid en welzijn;
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b van ABAB moet dit doo
 NOTA HUURDEKERS, EIGENMAKERS : Krachten het AREI bent u verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

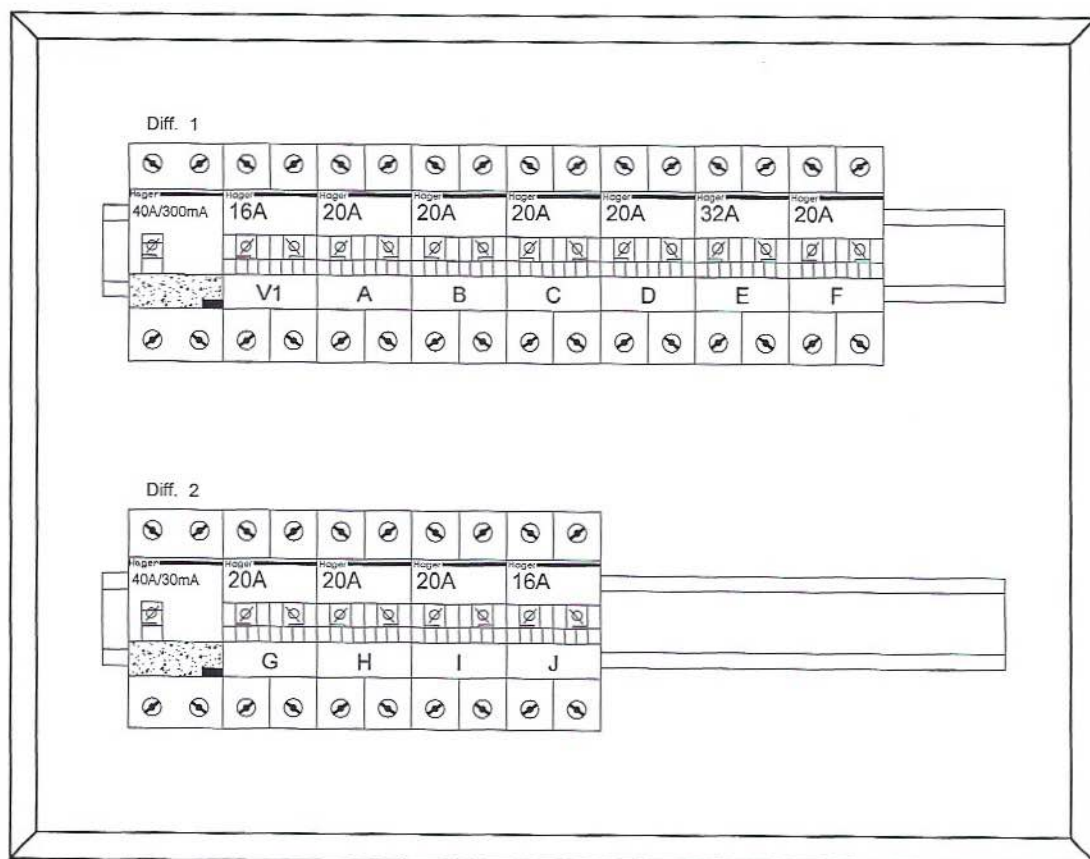

ID	Datum	Beschrijving	Get.
			El.bord D3.1 Projectnummer : 20111143 Datum : 08.12.2012 Get: RMa Schaal:

Les Jardins de Jette

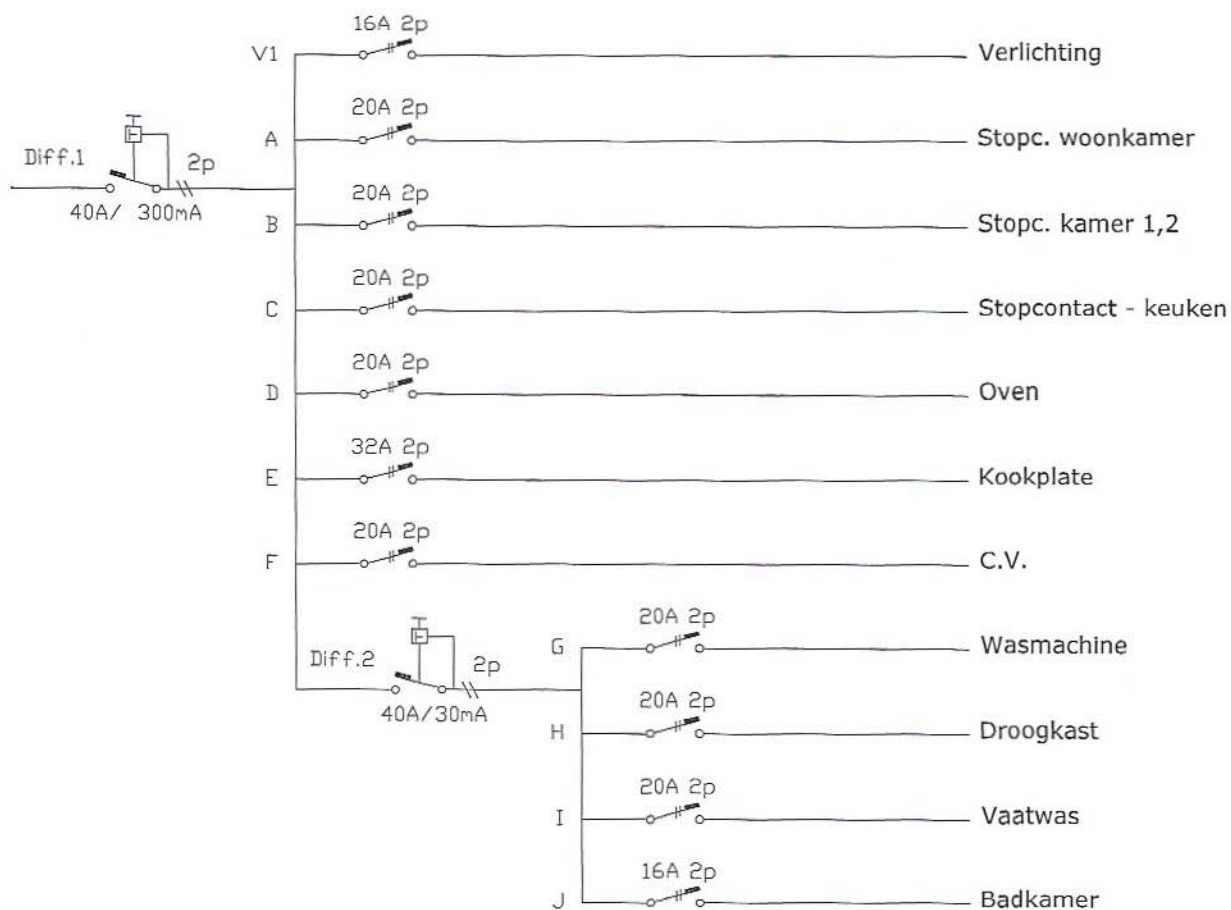

ID	Datum	Beschrijving	Get.
----	-------	--------------	------



Les Jardins de Jette

Eendraadschema D3.1

Projectnummer : 20111143

Datum : 08.12.2012

Get: RMa

Schaal:
