

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

bTV gekode

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. *2510245*
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *395/130822/05*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *3000 Leuven*
16 van Monststraat 8-1
EIGENAAR: *Beesemans-Meulemans*
Adres: *16 van Monststraat 8-1 Leuven*
OPDRACHTGEVER: *Beesemans-Meulemans*
Adres: *Leuven*
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: *22/8/13* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorshr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwarend verkoop wooneenheid Type der lokalen: *woning*
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning *230V mono* V Bescherming van de aansluiting *40* A
Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *diff 300mA/40A 4p*
Type van de aardelektrode: lus baren pennen horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: *3*; Aantal eindstroombanen: *11 + 7*; RA: *26* Ohm; RI tot *> 10* MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: *board 1 diff 40A/300mA* *board 3 TV in huis*
helder *C2 25A 6mm²* *C2 32A 6mm²*
C2 16A 2,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 16A 2,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 16A 2,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
board *C2 10A 1,5 mm²* *C2 20A 2,5 mm²*
C2 10A 1,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 10A 1,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 10A 1,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 10A 1,5 mm² *C2 20A 2,5 mm²*
C2 10A 1,5 mm²

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: *geen*

nota: schepa's keurplaatse
Herbeurping van verslag 334/111213/01

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingesloten van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *22/8/13* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: *395 Kaci Janssens*
nr. + naam + handtekening

De directeur,



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever :

Annelies Meulmans

Datum van verslag :

Datum van onderzoek :

Plaats van het onderzoek :

JB van muntstoot 21

U. ref. :

O. ref. :

TITEL:

VERSLAGNUMMER: 334 111213 01




1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit

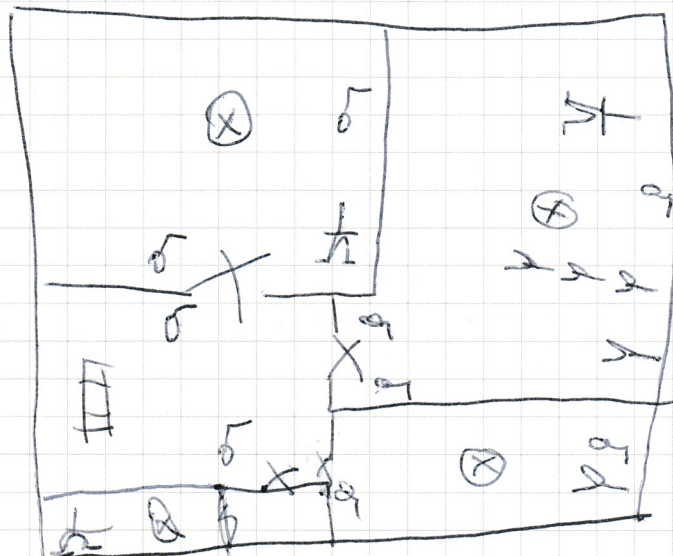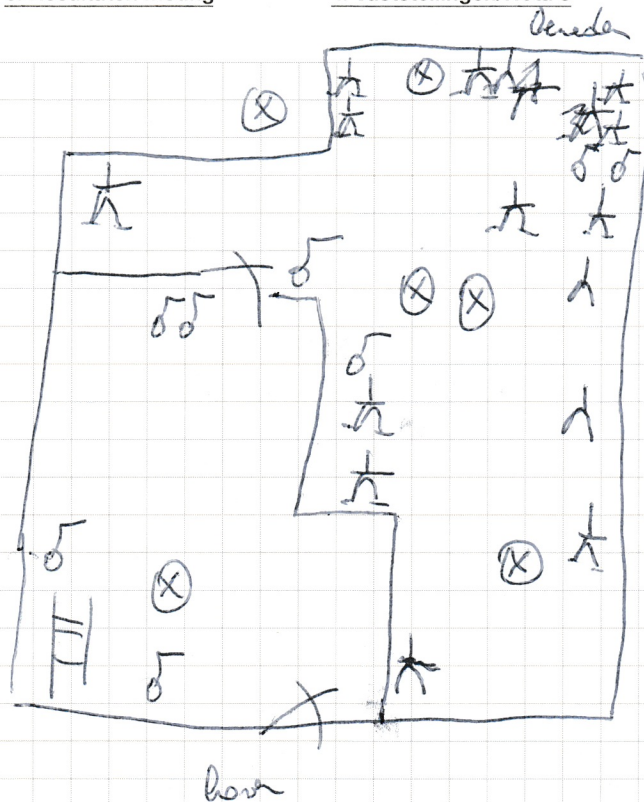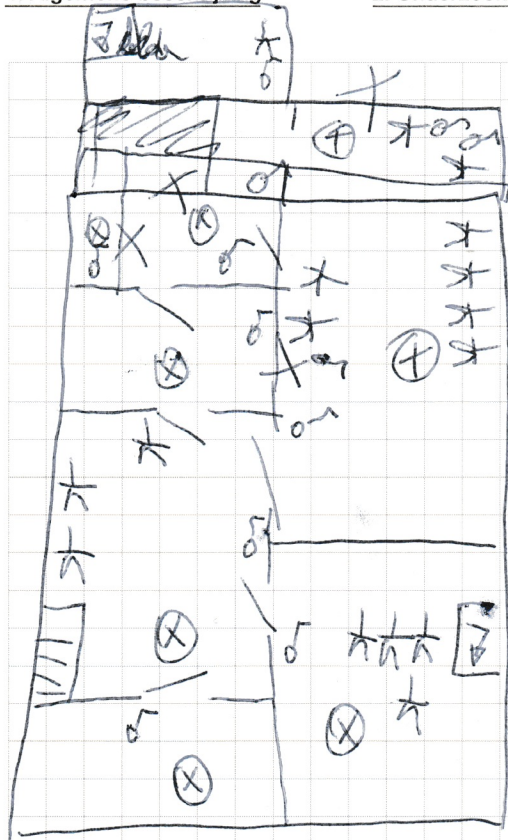

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Gelade

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 33411121307

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: J.B. van Moonsveld

81 Keuve

EIGENAAR: Annelies Meekmans

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 2570663

Index: I: 112 133 RVH 574 59 RVH 45

Datum van het onderzoek: 13/12/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 441

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning max 230V V Bescherming van de aansluiting 40A A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 40/93A

Type van de aardelektrode: tus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: _____; RA: 290 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Bord 1: 1 x 1 U25A 2P 6² XUB Bord 2: 3 x C10A 2P UOB, SUB

2 x U16A 2P 2,5² XUB

1 x 16A 2P 2,5² XUB

Bord 3: 1 x 32A 2P 6² UOB

12 x 20A 1P 2,5² UOB

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Schema's ontbreken

blauwe draad moet als nuldraden gebruikt worden

lusterleem en/of voor lichtpunten

Penantismaten moeten voorzien zijn van beschermkabel

Contactor en verbindingskasten moeten waterdicht zijn

differentieel reageert niet bij verliesstroom

Stopcontacten met pen moeten geïsoleerd (kabel)

zijn

Stopcontacten inbouwen volgens goed vakkennis

Rubriek 1.1.1 uit Volume 1 baddonen


PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 11 maanden na date

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

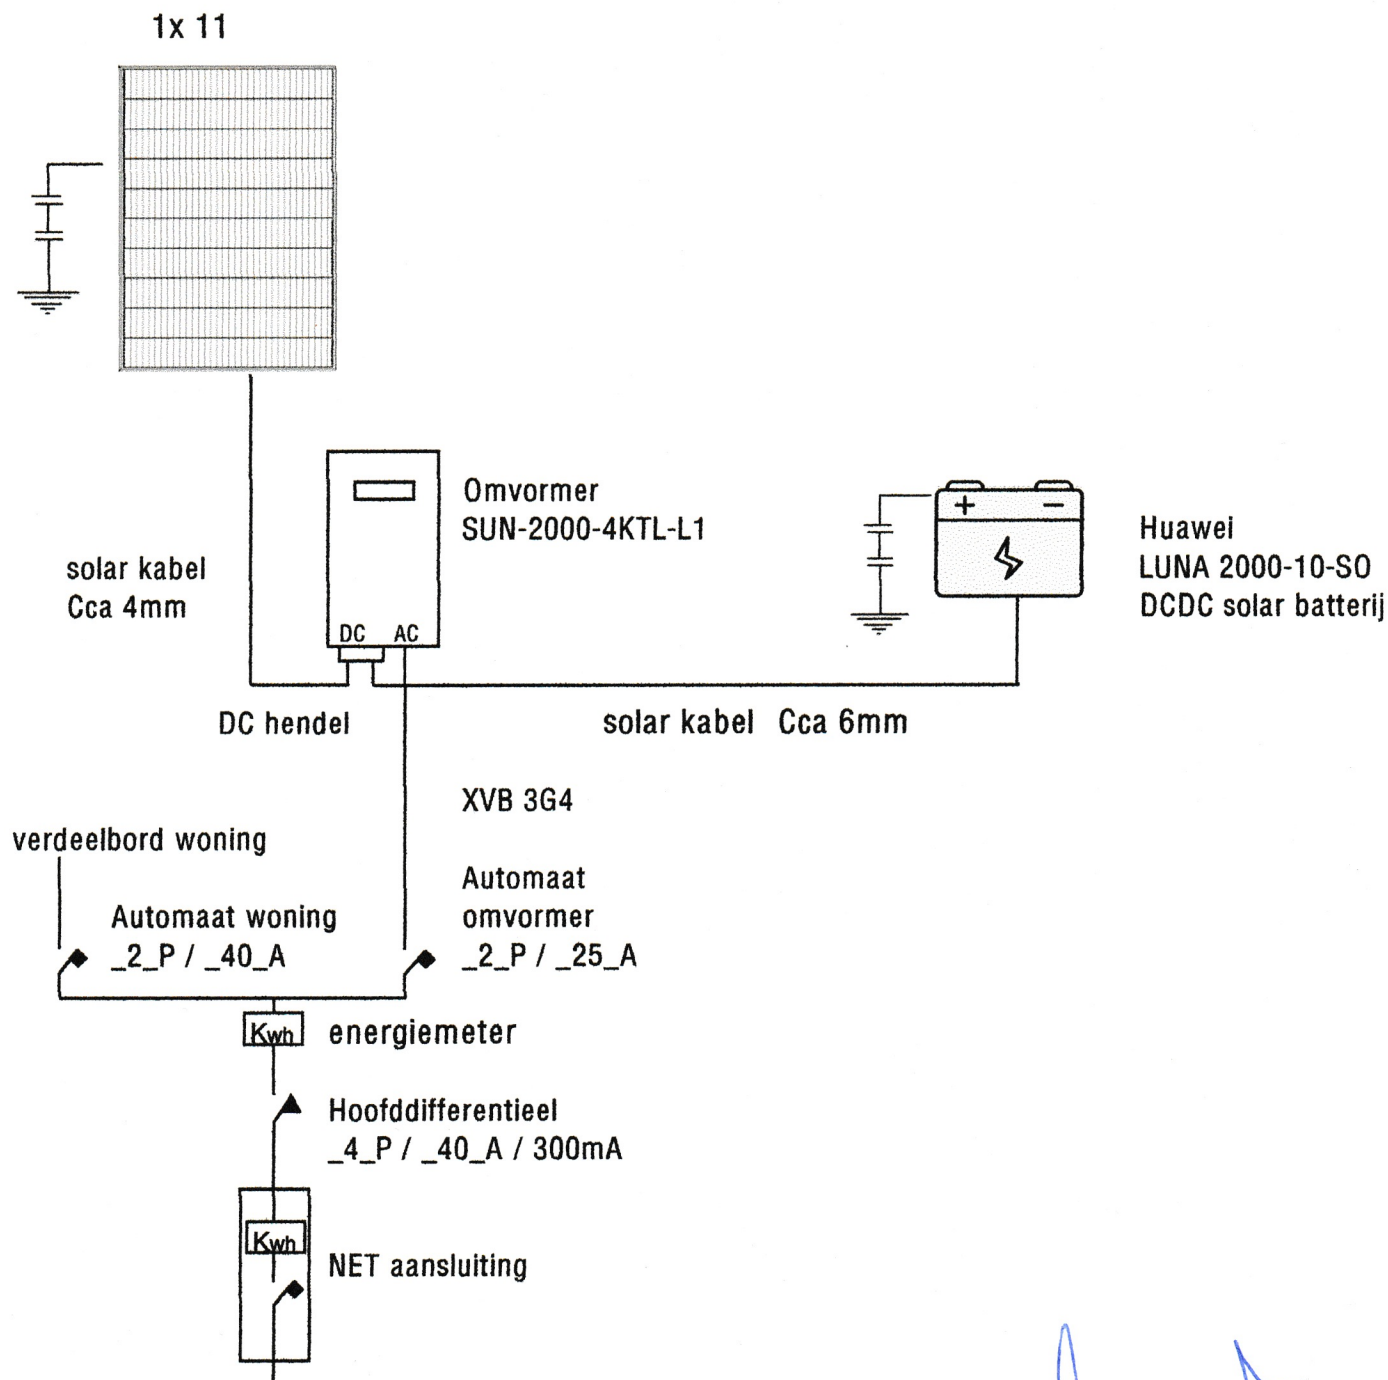

de eigenaar,
Dhr. Dimitri Beesemans

de installateur,
Batisol bvba, Bart Geerts

de keurder,

ELECTROTEST
Patrick Schockaert
Electro-Test
Batisol bvba, Bart Geerts
07/09/2015

Electro-Test

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°:	200793	Datum onderzoek:	31/05/2016
Agent-bezoeker:	Paternoster Michaël	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20160741
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	JB Van Monsstraat 81 , 3000 LEUVEN		
Distributienetbeheerder:	Iverlek (via Eandis)		
Teller n°:	2510245		
Index teller:	Dag: 132653,00	Nacht:	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	RAKO ES	Adres opdrachtgever:	Vleugtweg 13, 3111 WEZEMAAL
Naam eigenaar:	Beesemans - Meulemans	Adres eigenaar:	JB Monsstraat 81, 3000 Leuven
Installateur:	RaKo es bvba		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Uitbreiding keuken		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XVB 2 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	9

Differentieelschakelaars:

In:	Δ:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen woning # 9	A - I	2,5mm ² , 4mm ²
Algemeen vb keuken # 9	A - I	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	25,00	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	79,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 31/05/2041 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:	Ééndraadschema's: JA	Situatieschema's: JA	Andere:
-------------------------	----------------------	----------------------	---------

Voor de directeur, de agent-bezoeker
 Paternoster Michaël

Visum DNB (art. 270)



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Extra opmerkingen :

De keuring omvat enkel het gedeelte geplaatst door RaKo. De bestaande installatie is niet conform met het AREI en dient aangepast te worden.


VASTSTELLINGEN: Nota's



Nota's algemeen :


- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.

Raadgevingen

- a. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

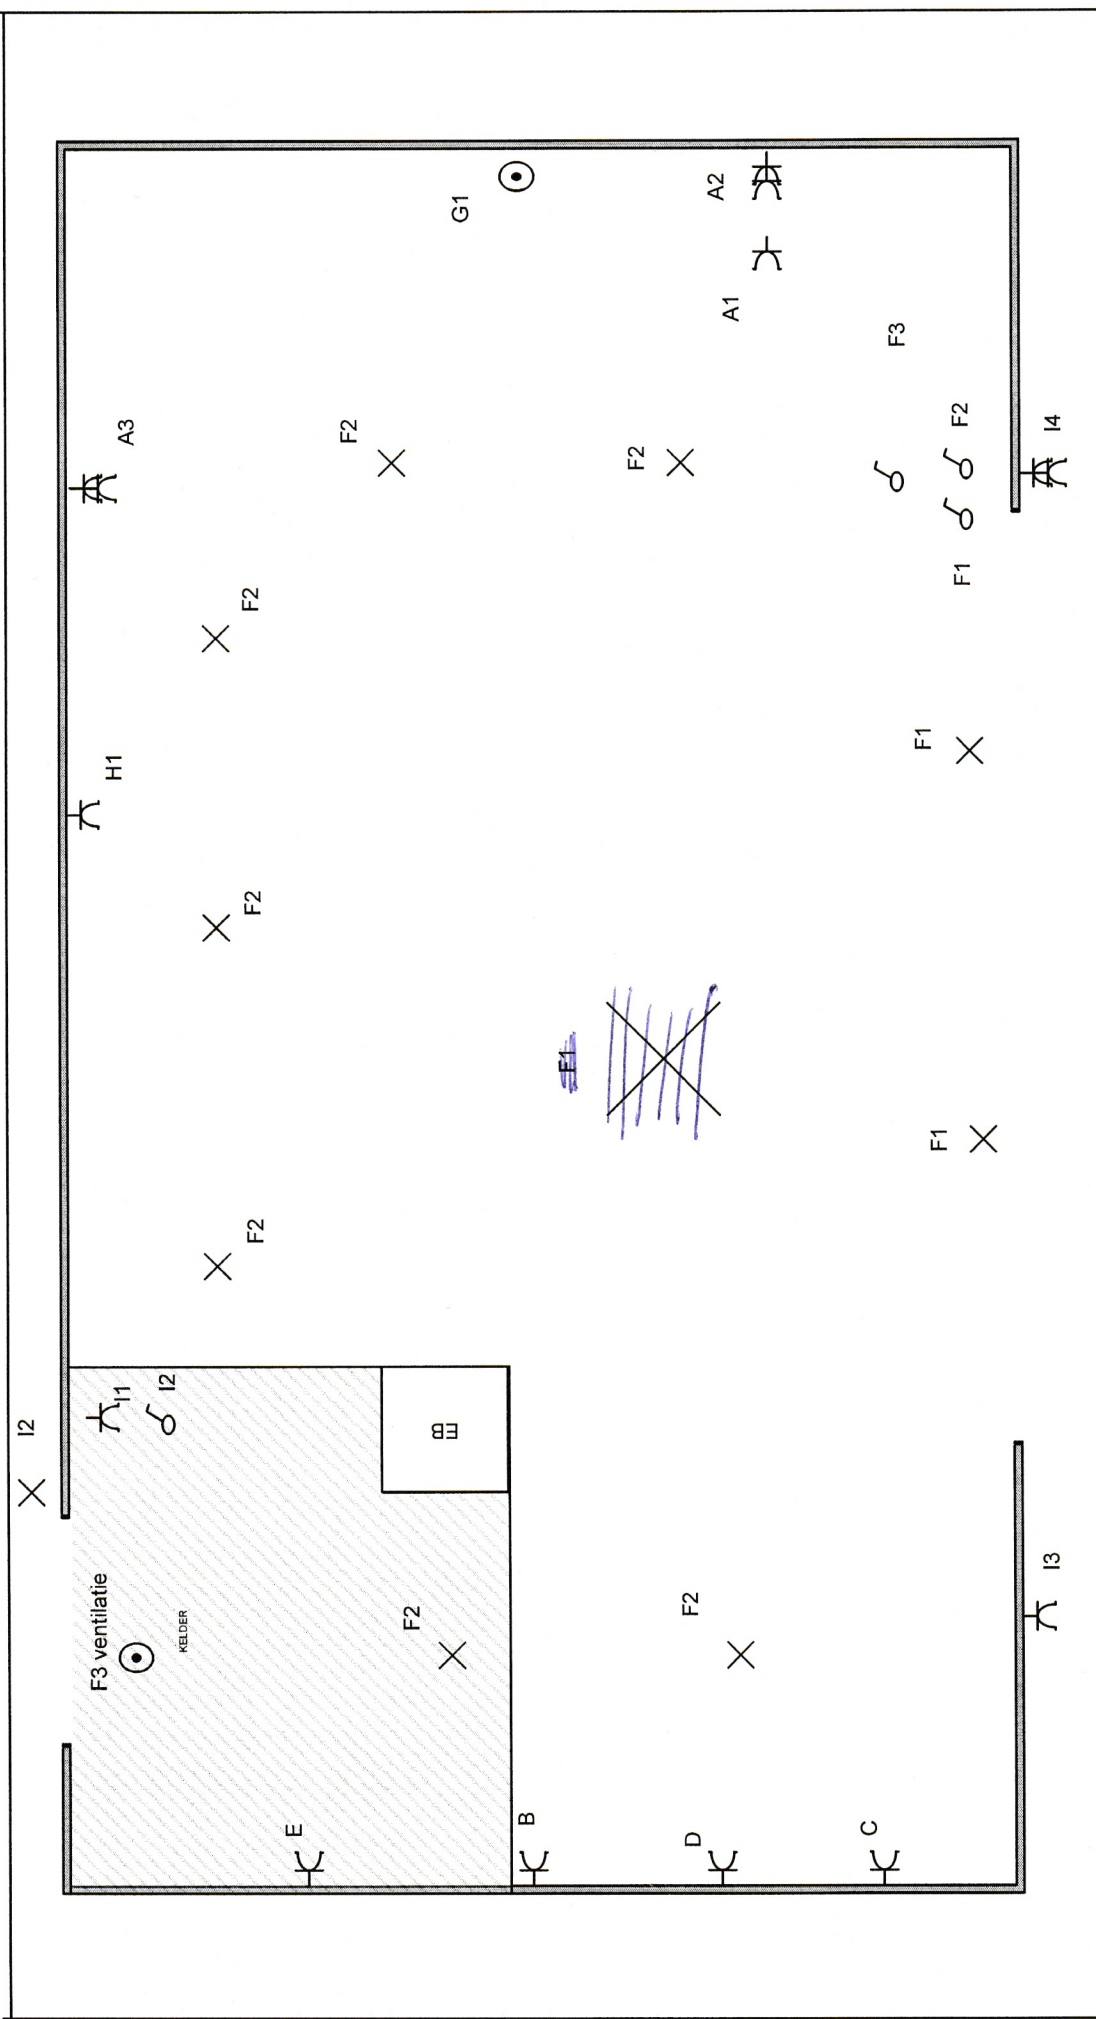

Situatieschema	Eigenaar: Beesemans - Meulemans Uitbreiding keuken JB MONSSTRAAT 81 3000 Leuven	Enkel de kringen zoals op het eendraadschema aanwezig zijn voorzien door RAKO	Keuringsorganisme: Naam keurder:
RAKO ELECTRICAL SOLUTIONS	Handtekening 	RAKO ES BVBA VLEUGTWEG 30 3111 WEZEMAAL	Adres:  ATECON VZW Michael Paternoster 0472/02 25 58 michael.paternoster@atecon.be
			Handtekening: 

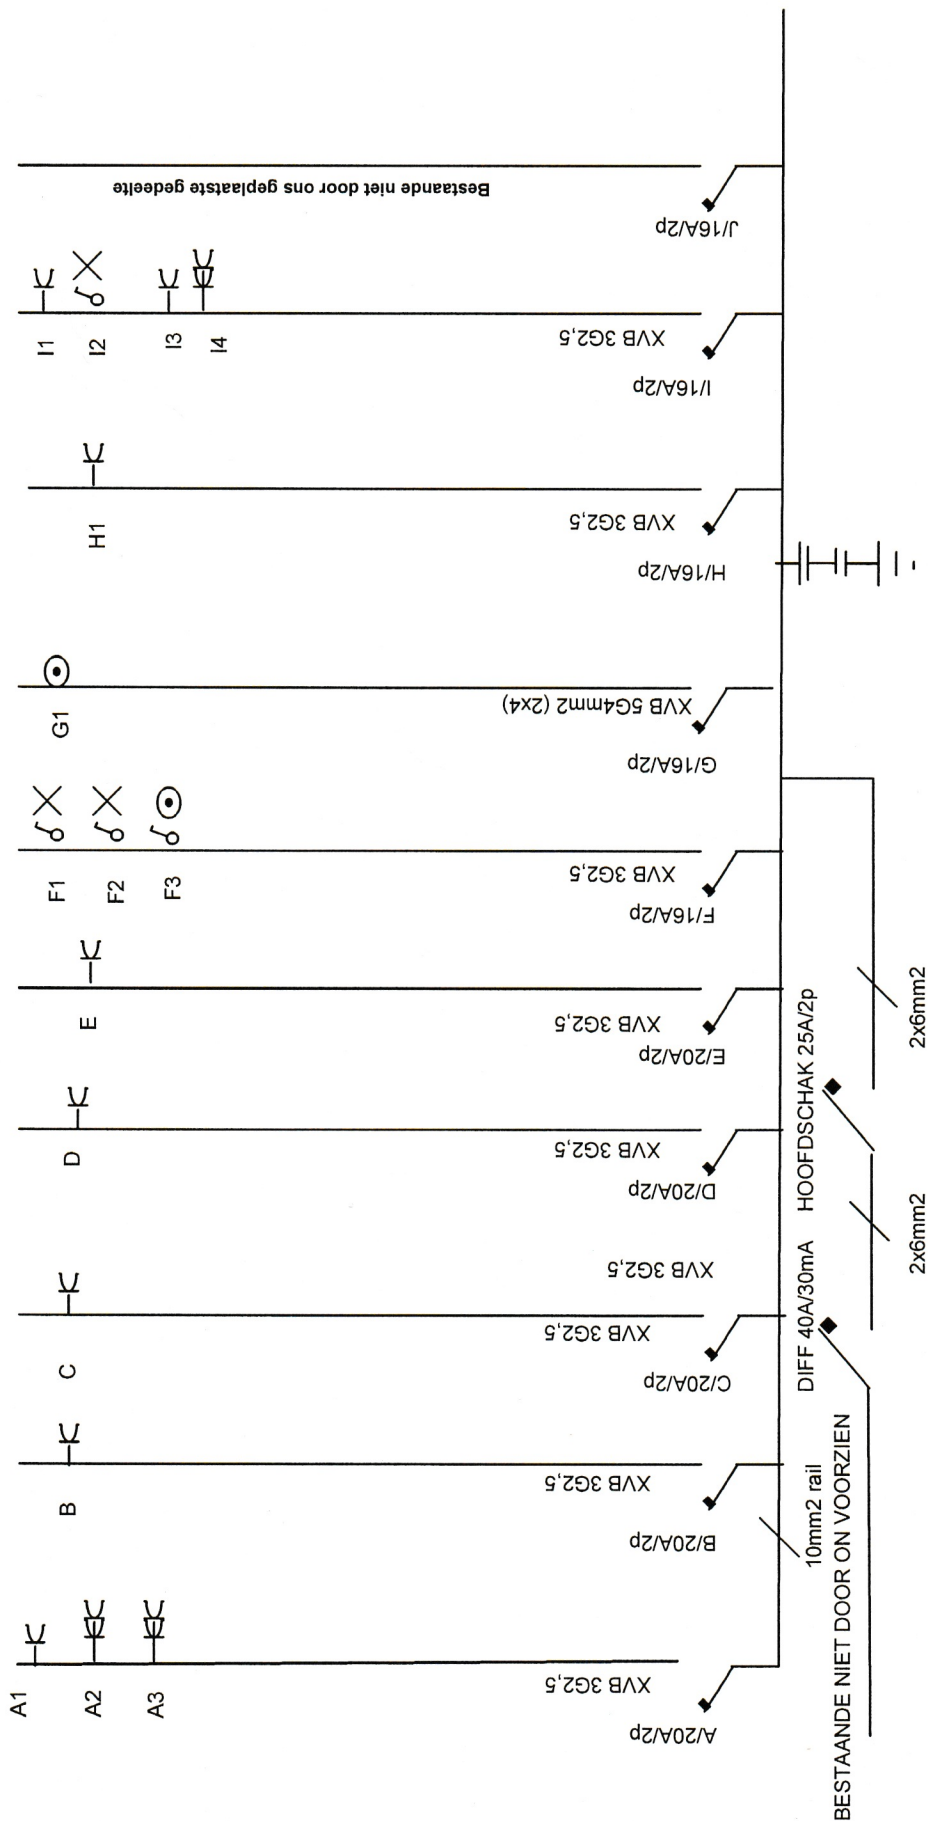

Eendraadschema

RAKO
ELECTRICAL SOLUTIONS

Eigenaar
Beesemans - Meulemans

Uitbreiding keuken
JB Monssstraat 81
3000 Leuven

Enkel keuring van de door ons geplaatste delen volgens situatieschema

RAKO ES BVBA
VLEUGTWEG 30
3111 WEZEMAAL

Handtekening

Keuringsorganisme:
Naam keurder:



Adres:
ATECON vzw
Michiel Paternoster
0472/02 23 38
michiel.paternoster@atecon.be

Handtekening:

31/05/16
