

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0477/471099
e-mail: stefaan.misschaert1@telenet.be



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5522149
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/01/2021

Klant / Opdrachtgever:

Misschaert Stefaan
Oorlogsinvalidenlaan 36/0201
8434 WESTENDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 552 VANWACHTENDONCK NICK
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: MISSCHAERT Adres: OORLOGSINVALIDENLAAN 36/0201-WESTENDE
Stefaan
Installateur/verantw. werk: Naam: MISSCHAERT Adres: BEEKLAAN 14-KORTRIJK
Stefaan B.T.W.:
Adres installatie: MISSCHAERT STEFAAN OORLOGSINVALIDENLAAN Private HS-cabine: NEE
36/0201 WESTENDE 8434
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: OORLOGSINVALIDENLAAN
36/0201-WESTENDE-ELE
EAN nr.: 541 449 611 000 347 984 Leverancier: - Teller nr.: 5314039 Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
(*) Bij controle hfst.8.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 19/01/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2046 Installatiedatum: vóór 01/10/1981

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Ontbeken Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1+3
BORD TELLER : 1x Diff. 40A 300mA 2P, 1x 32A 2P.
BORD APP : 1x Diff. 40A 30mA 2P, 1x 16A 2P, 2x 20A 2P

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 29,4 MOhm Spreidingsweerstand: 29,8 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,




Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

overzichtsplan

pagina 3 v. 4

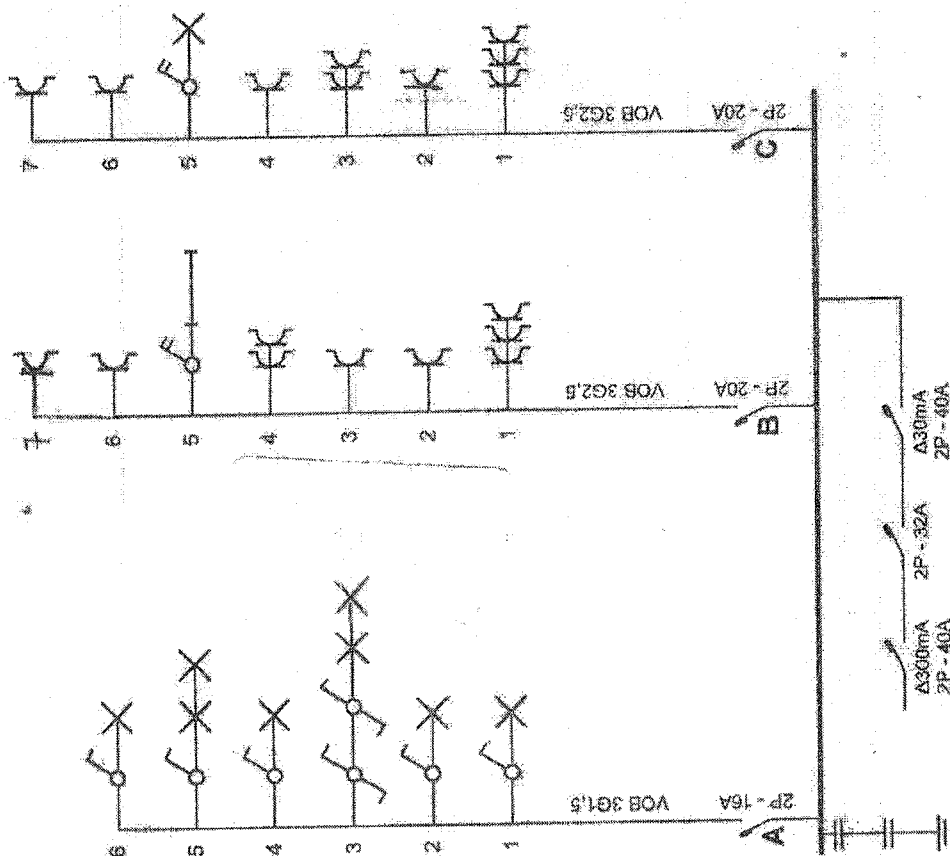

Installatie is gecontroleerd door :
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : Nick Vanwachtemdonck
Datum : 19 / 01 / 2021
PV nr.: 5522149
Handtekening :

p. 1/2
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Sjefaan Misschaert

Tel.: -
Fax: -
e-mail: -


GSM: -

Plaats van de elektrische installatie

Misschaert - Favere
Oortogshvaldenlaan 36 Bus 0201
8434 Westende
Tel.: - GSM: 0477/471099
Fax: -
e-mail: sjefaan.misschaert1@telenet.be

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00 GSM: -
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.els@ocb.be

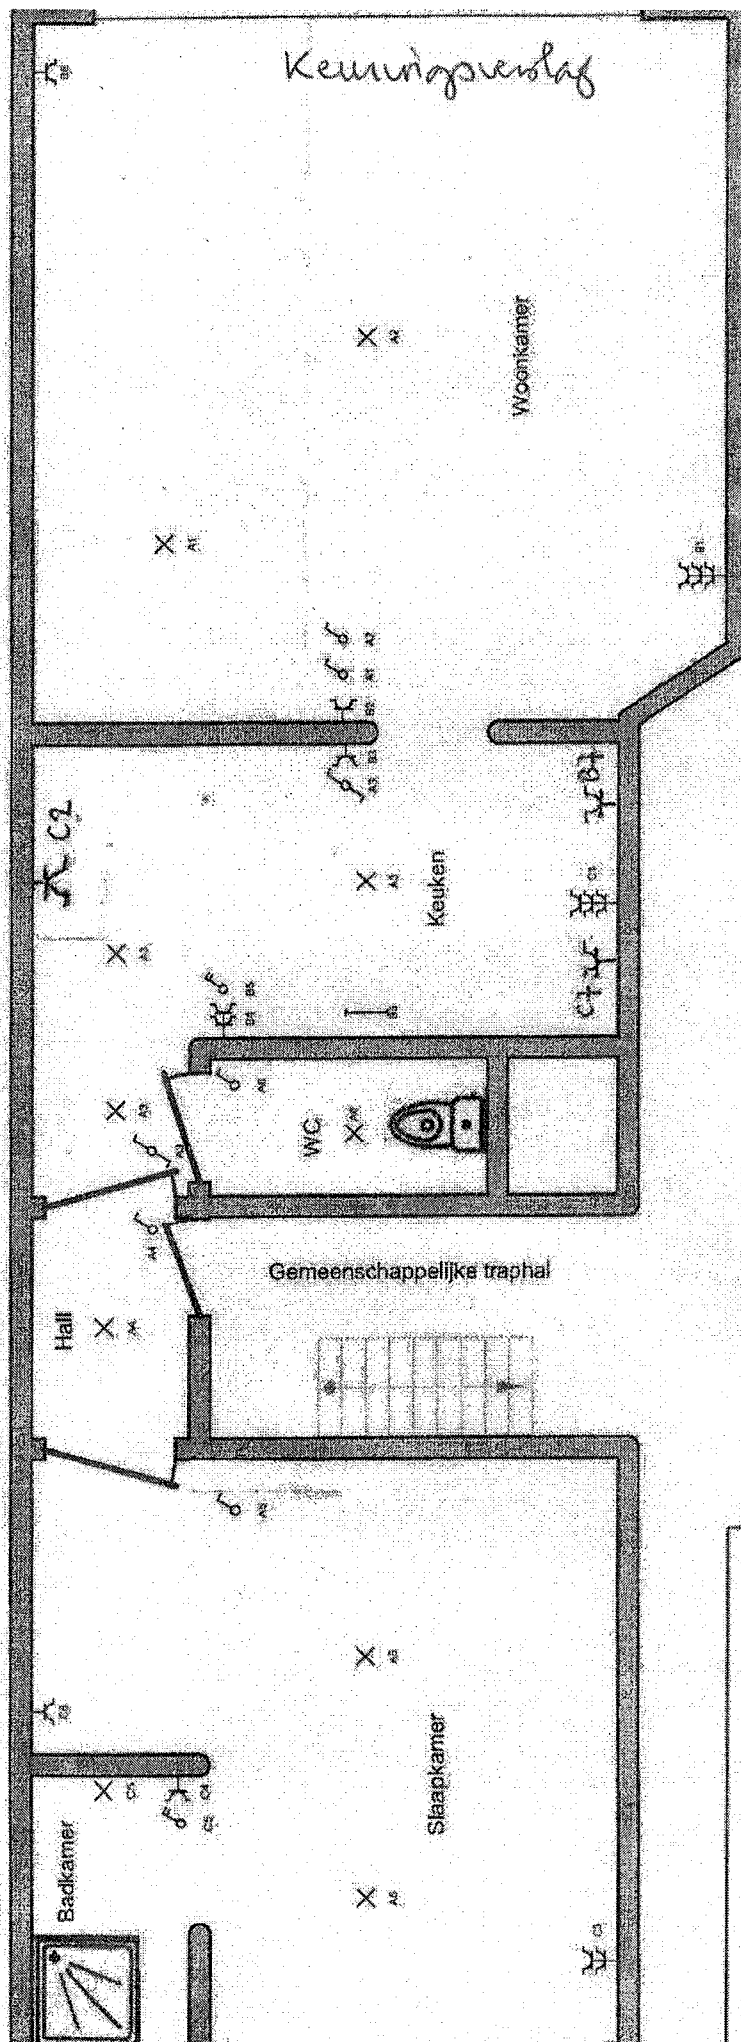

tallatie is gecontroleerd door :
 B. Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 derzoeker: Nick Vanwachendonck
 datum : 19 / 01 / 2021
 nr.: 5522149
 ondtekening :

2e Verdieping

Erkend Organisme

O.C.B.
 Konigin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00 GSM: -
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Misschaert - Favers
 Oorlogsinvalidenlaan 36 Bus 0201
 8434 Westende
 Tel.: - GSM: 04 77 47 1099
 Fax: -
 e-mail: stefaan.misschaert@telenet.be

Installateur
 Stefaan Misschaert

Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/2

Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz
