



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

P048542473



N 168384

Resi code: 1

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: Brown Leslie	Naam, voornaam: Seynaeve Stel
Ident. Kaart nr.:	Adres: Kortrijksesteenweg 31
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: 3000 Gent
	Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☐ ① Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276: verzwarende	☐ Art 88 ☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art ... ☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN: 541448860014607740 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 2980685 meterstand dag: 32 nacht: 32 ☐ kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm ² - Type: XVB
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18
☒ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 2,4 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen inbreuken vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie	
Opmerkingen	
☐ Nihil	
☐ Nihil	
☐ Nihil	

Visum DNB of aangestelde:

20/9/2016

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: **Dhondt Davy**Agent nr.: **4854** Datum: **19/9/2016**Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): **1**☒ Eéndraadsschema(s): **3**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór


☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

Davy DHONDT
Inspecteur

4854

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen zijn ingelid, te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

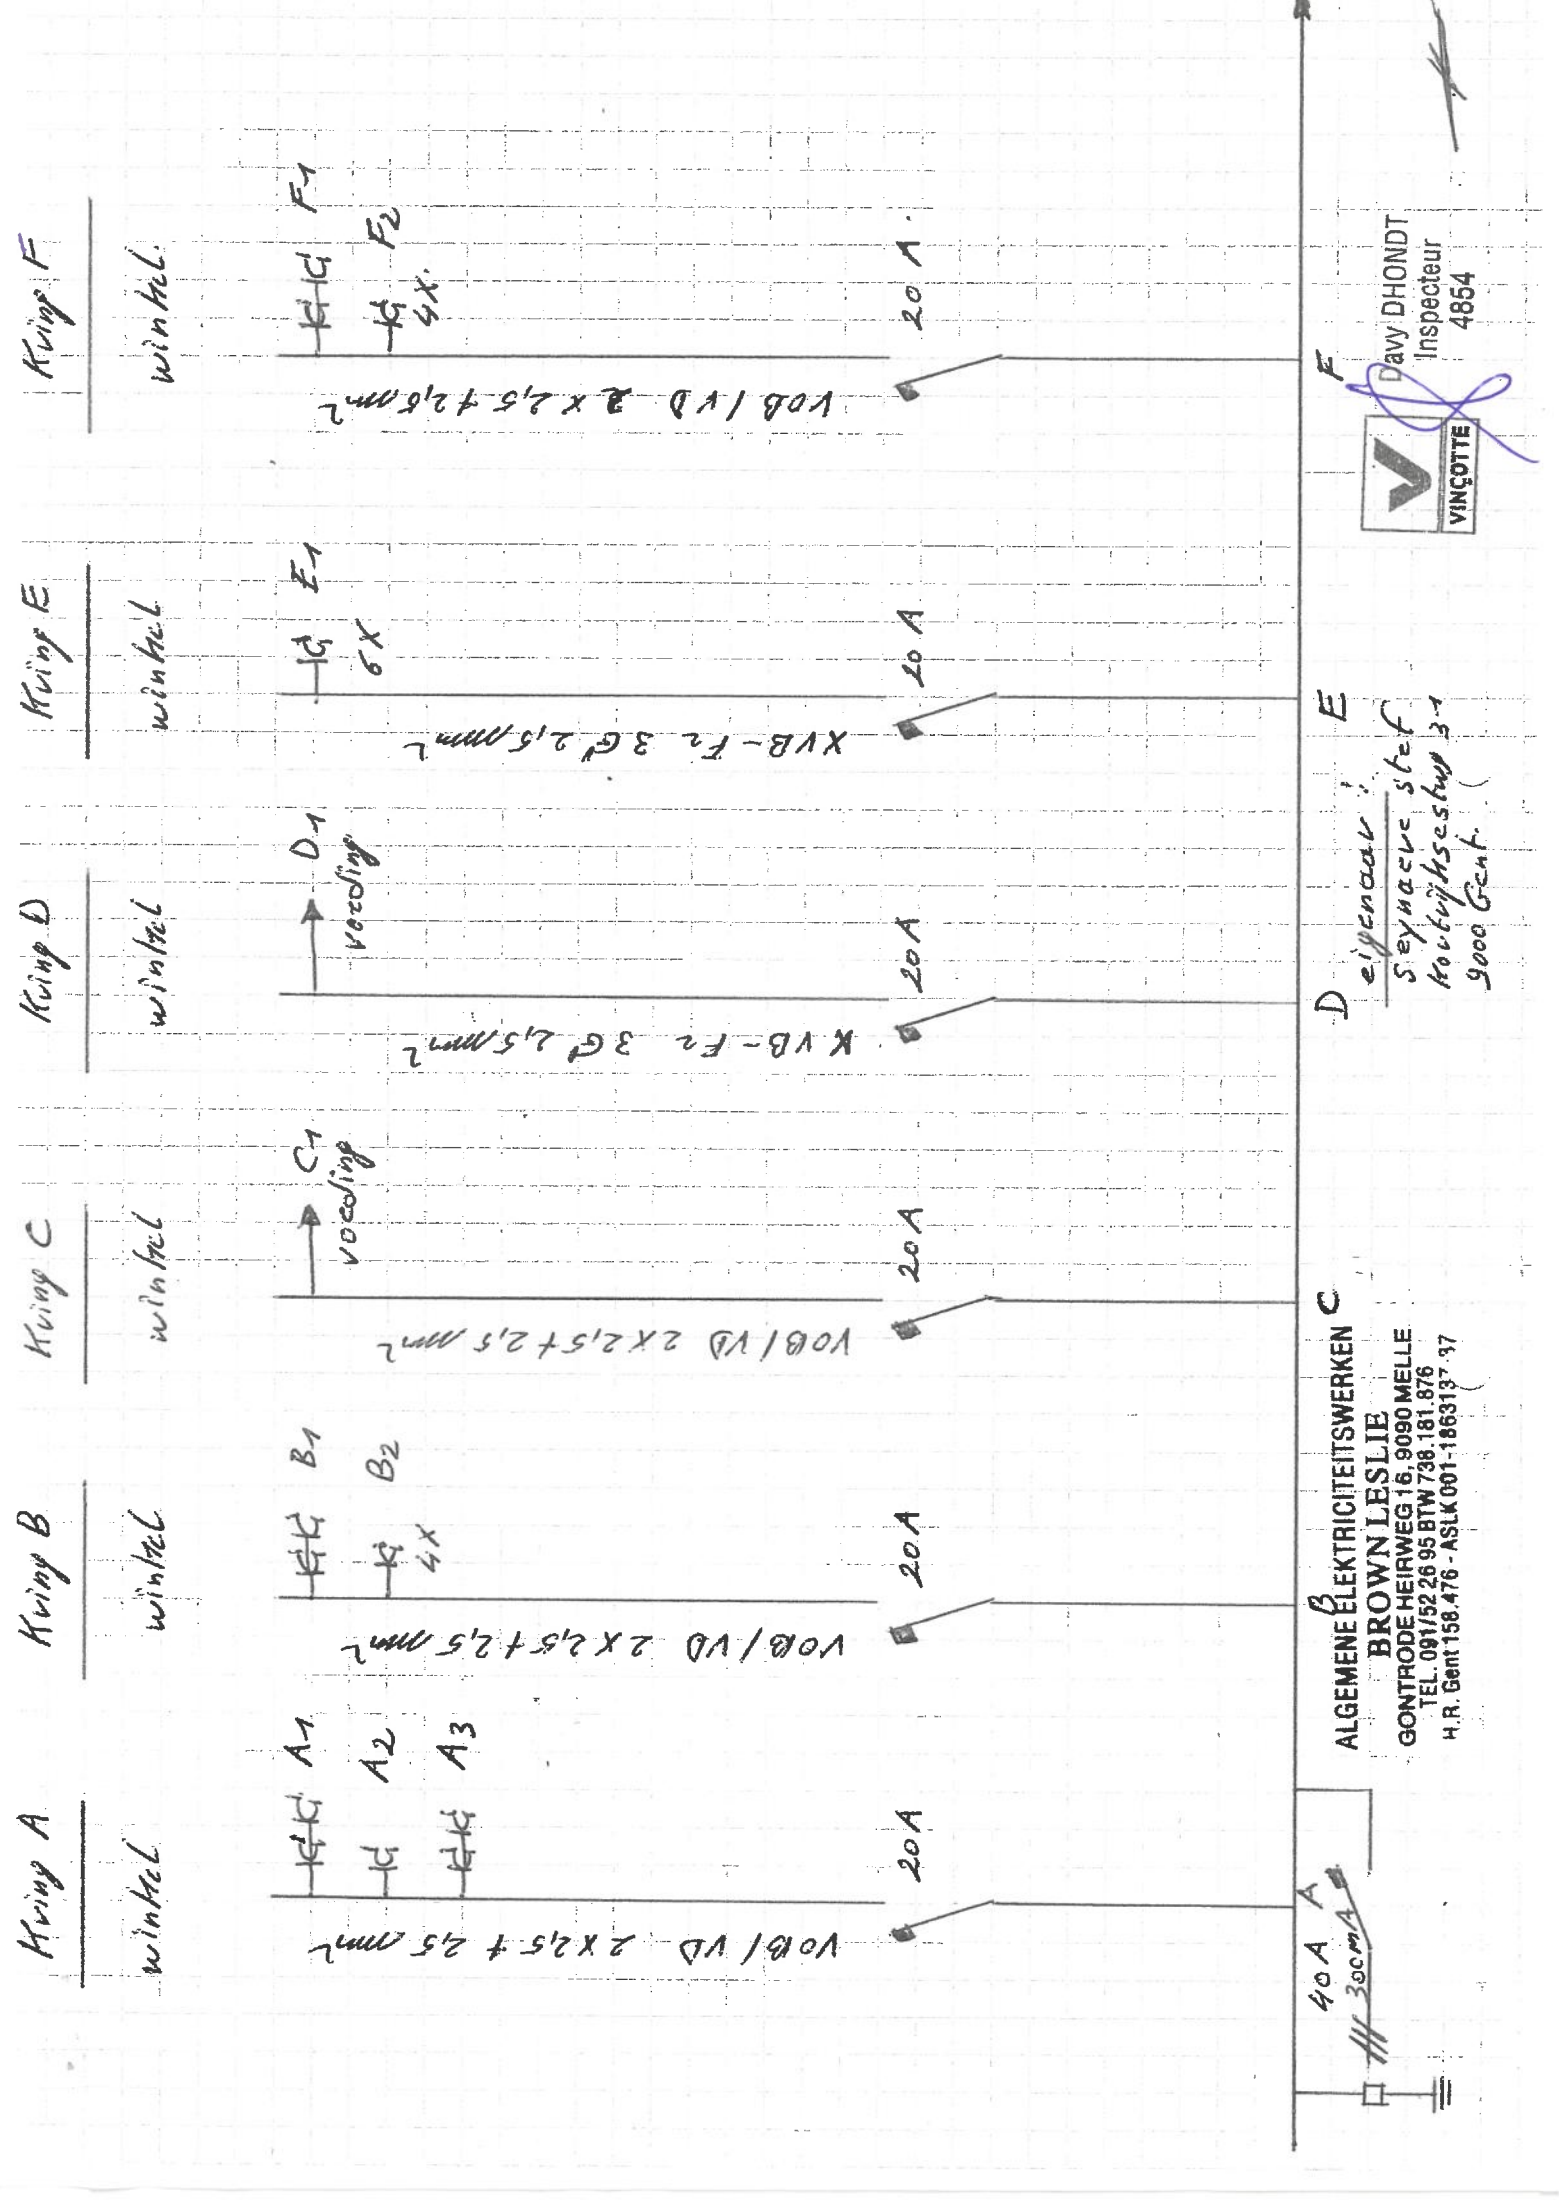

Kring A

Kring B

Kring C

Kring D

Kring E

Kring F

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

winkel

A1
A2
A3

B1
B2

C1
voeding

D1
voeding

E1
6x

F1
F2
4x

$VOB/VD \ 2 \times 2,5 + 2,5 \text{ mm}^2$

$VOB/VD \ 2 \times 2,5 + 2,5 \text{ mm}^2$

$VOB/VD \ 2 \times 2,5 + 2,5 \text{ mm}^2$

$KVB-F_2 \ 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

$XVB-F_2 \ 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

$VOB/VD \ 2 \times 2,5 + 2,5 \text{ mm}^2$

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

40 A
300 mA

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
BROWN LESLIE

GONTRODE HEIRWEG 16, 9090 MELLE
TEL. 091/52 26 95 BTW 738.181.876
H.R. Gent 156.476 - ASLK 001-1863137-97

D
eigenaar:

Seynaeve stef
Kortrijksesteenweg 3-1
9000 Gent

F



Davy DHOND
Inspecteur
4854

Hving G

winkel

G₁

VOB/VD 2 X 2,5 + 2,5 mm²

20A

Hving H

winkel

H₁

XVB-F2 3 G 2,5 mm²

20A

Hving I

maga zijn
+ berging
en san. gedeelte

I₁
X
X
X

XVB-F2 3 G 1,5 mm²

16A

Hving J

maga zijn
berging
san. gedeelte

J₁
4X
J₂
J₃

VOB/VD 2 X 2,5 + 2,5 mm²

20A

Hving K

maga zijn

K₁
K₂
K₃

VOB/VD 8 X 2,5 + 2,5 mm²

20A

Hving L


maga zijn

L₁
→
voeding

XVB-F2 3 G 2,5 mm²

20A

8

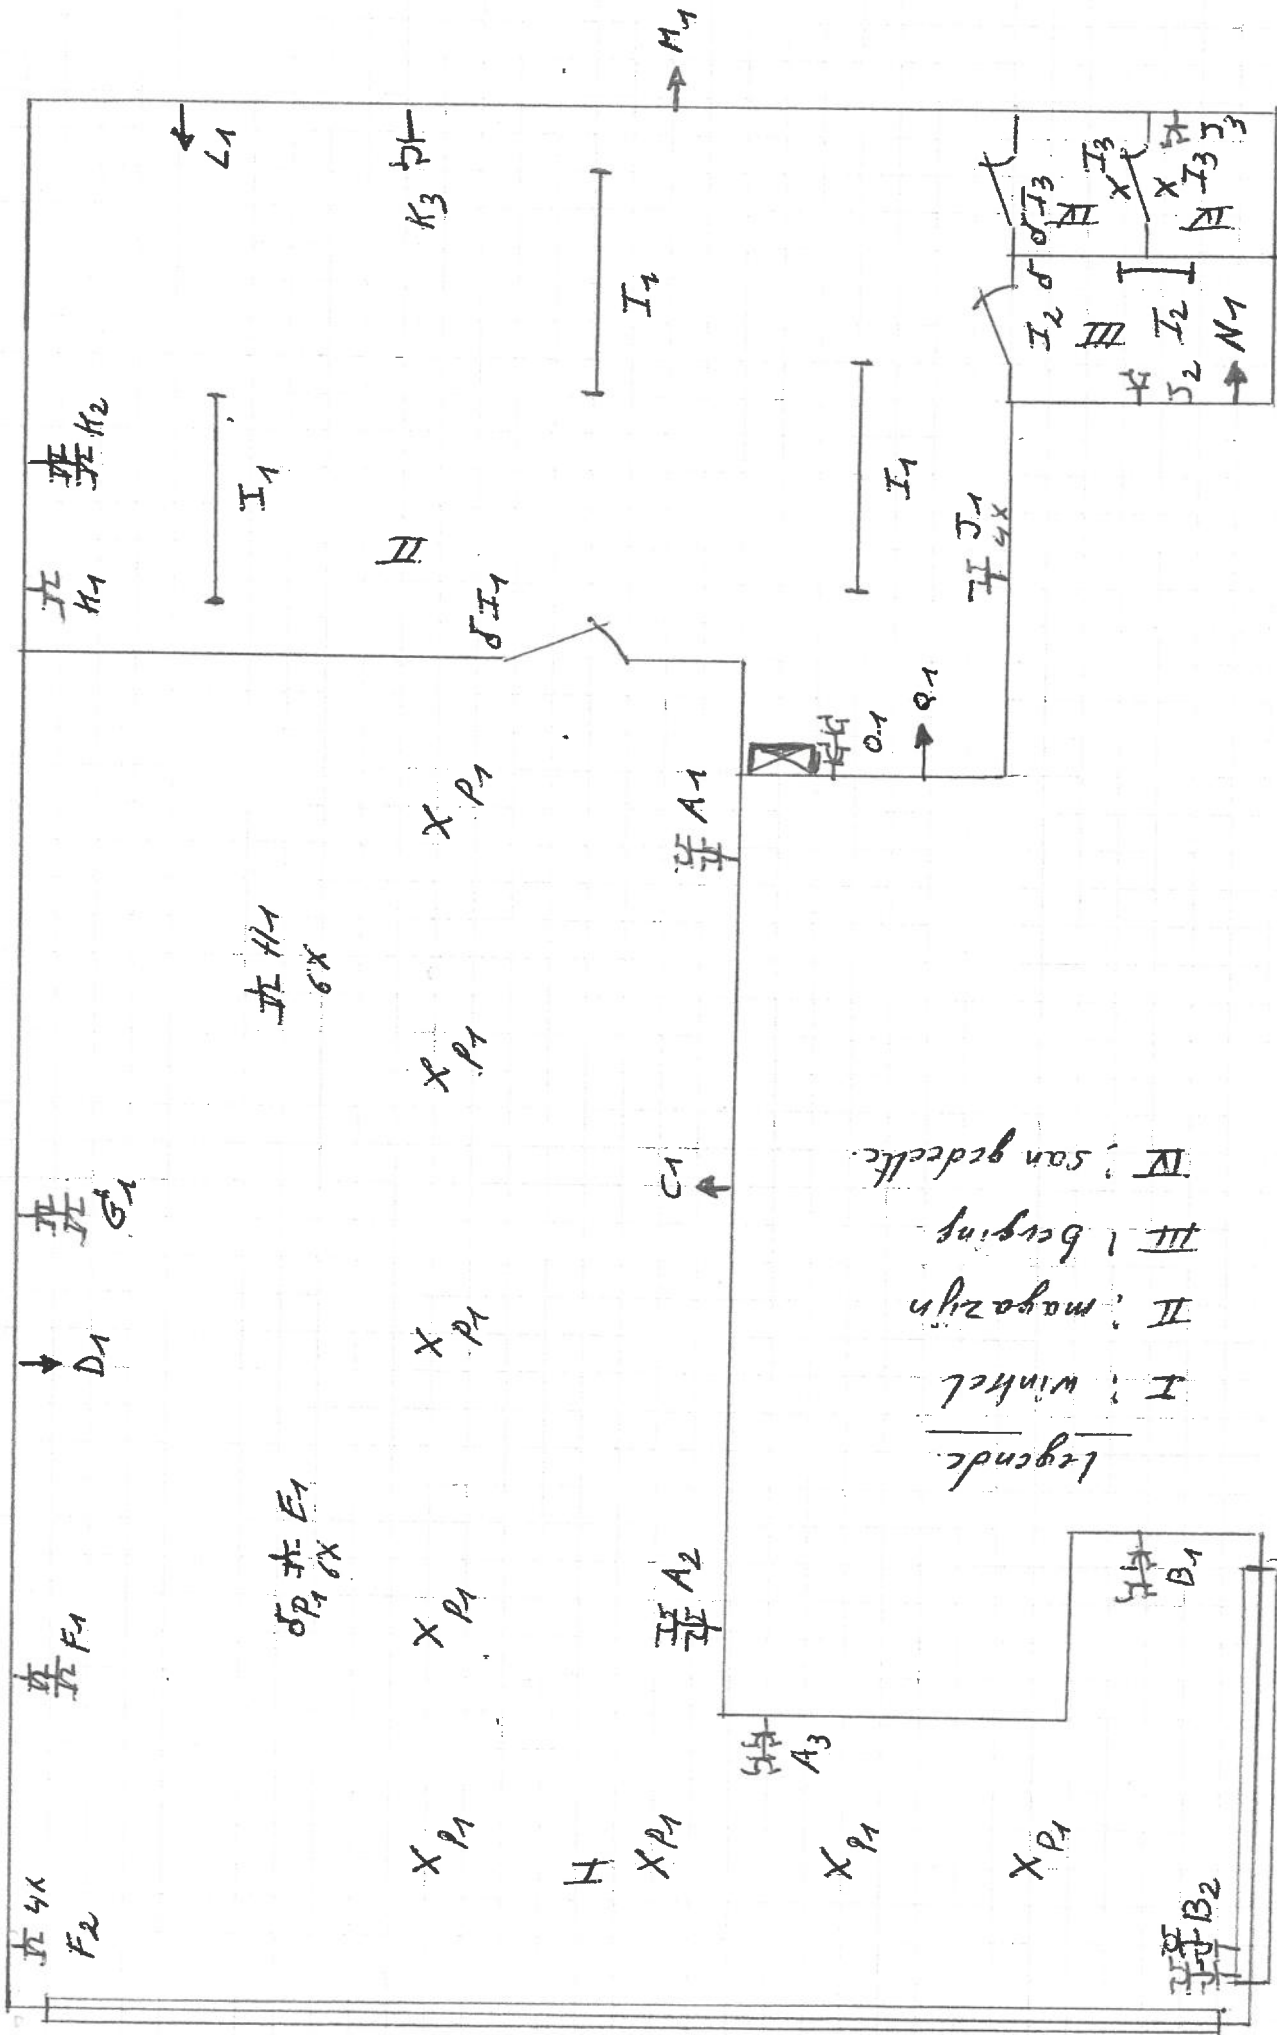

Verdeelbord 2 x 230V

Kring A	stopcontacten winkel	20A
Kring B	stopcontacten winkel	20A
Kring C	koeltoog rechts winkel	20A
Kring D	koeltoog links winkel	20A
Kring E	stopcontacten kassa	20A
Kring F	stopcontacten hoek winkel	20A
Kring G	stopcontacten winkel	20A
Kring H	stopcontacten werktafel	20A
Kring I	verlichting magazijn, berging, sanitair gedeelte	16A
Kring J	stopcontacten, berging, sanitair gedeelte	20A
Kring K	stopcontacten magazijn	20A
Kring L	koelcel magazijn	20A
Kring M	airco	20A
Kring N	ventilatie	16A
Kring O	stopcontacten aan verdeelbord voor Telenet	16A
Kring P	verlichting winkel	16A
Kring Q	boiler	16A
Kring R	reserve	16A
