

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/10/2019 **Inspecteur:** Michael Schnurrer **Mentor:** **Installateur:** Van Den Brande ELEKTRO BVBA

ID-label: App. nr. 76 gelijkvloers **Client reference:**

B.T.W. nr.: BE 664 953 311 **IK. nr.:-**

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lindelei
Huisnummer 76
Busnummer GLV
Postcode 2620
Gemeente Hemiksem

Naam contactpersoon Wim Van den Brande
Telefoon 0477/77.14.22
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Lindelei
Huisnummer 76
Busnummer GLV
Postcode 2620
Gemeente Hemiksem

Installateur

Naam Van Den Brande ELEKTRO BVBA
BTW nr. BE 664 953 311
Telefoonnummer 0477/77.14.22
E-mail vdb.elektro@telenet.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: 503801

Aard onderzoek:

Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 10 Isolatie: 0,87 MΩ
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 7,87 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A			
30	40		22,5kA2s (3000A)	A			

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
4	C	16		2	-
4	C	20		2	-
1	C	32		2	-
1	C	10		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☒ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O28 Volgens Art; 278 is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 1/10/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.





De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90


BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/10/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

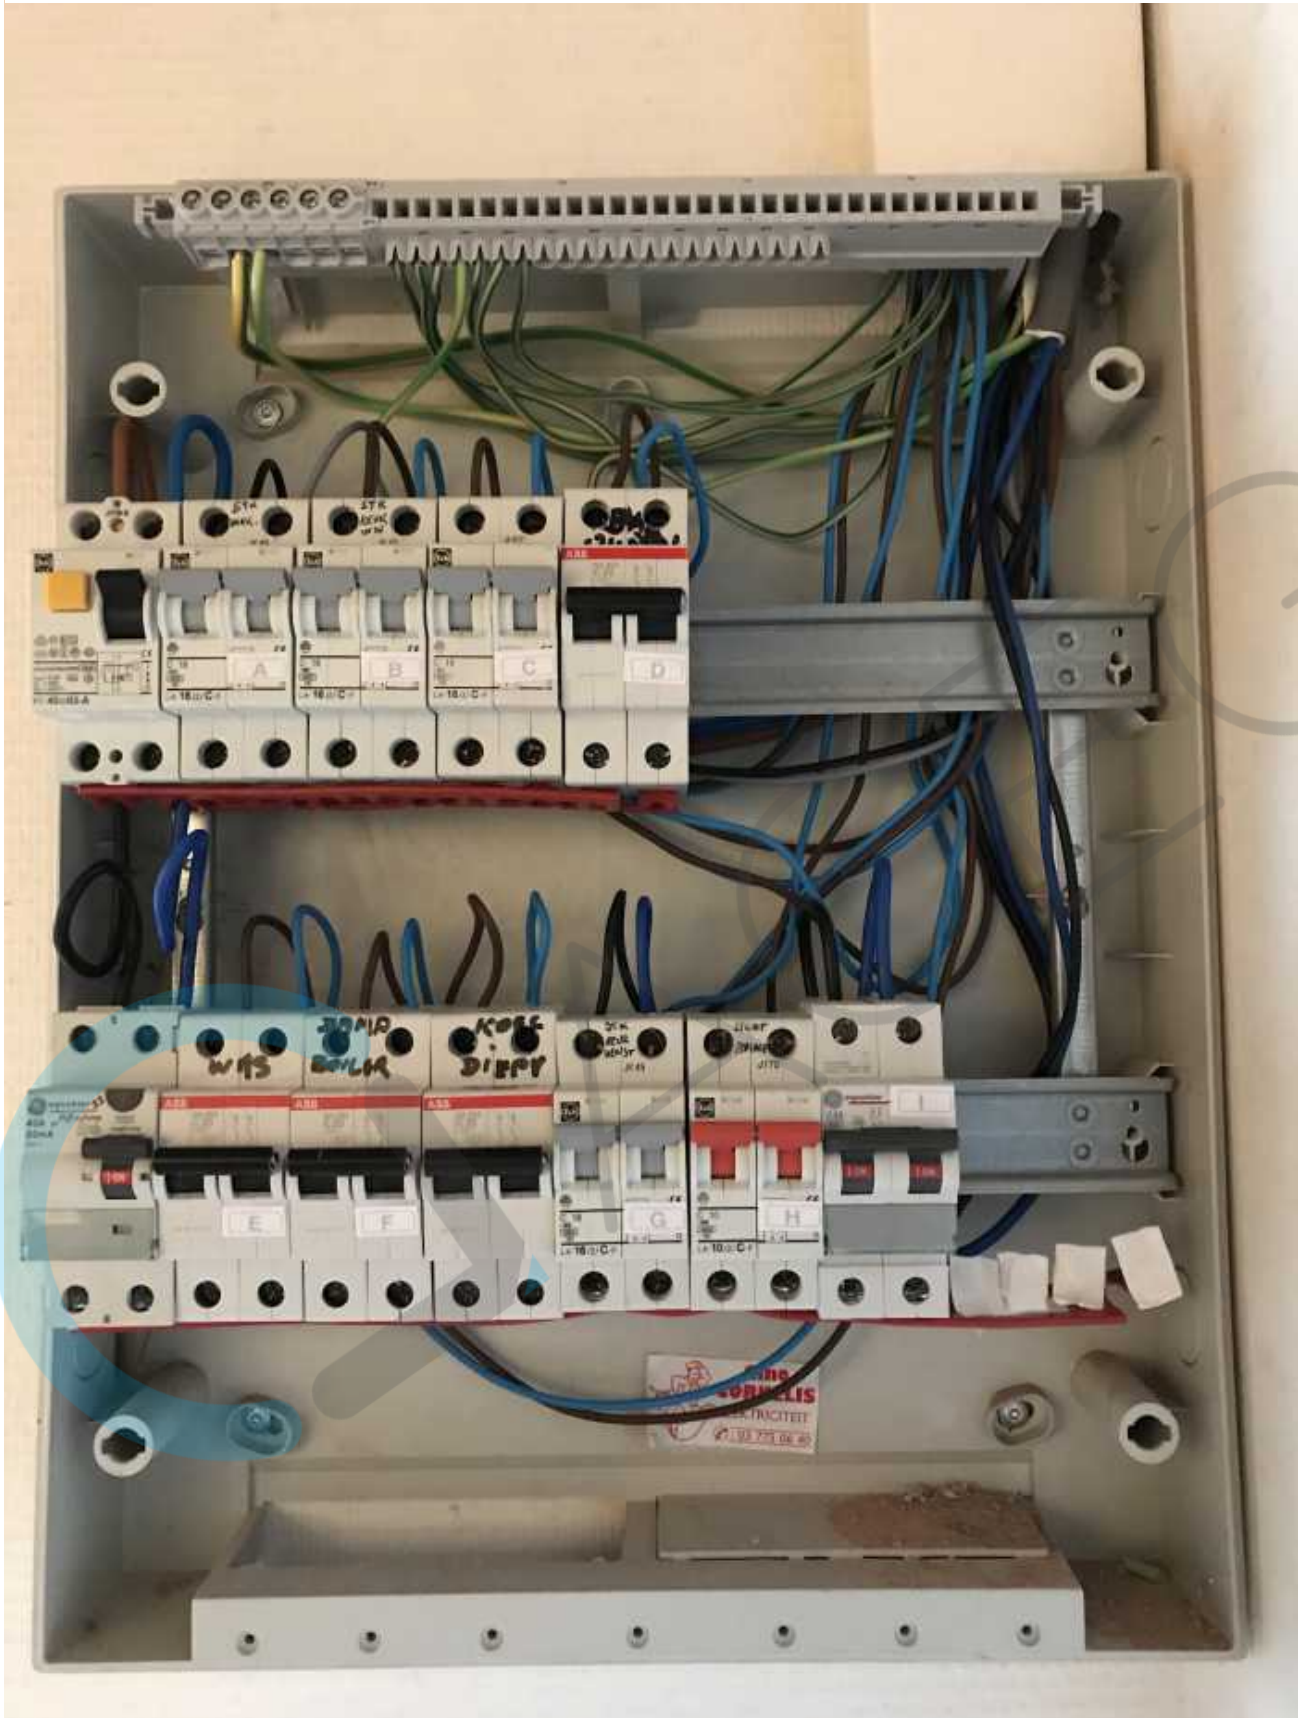

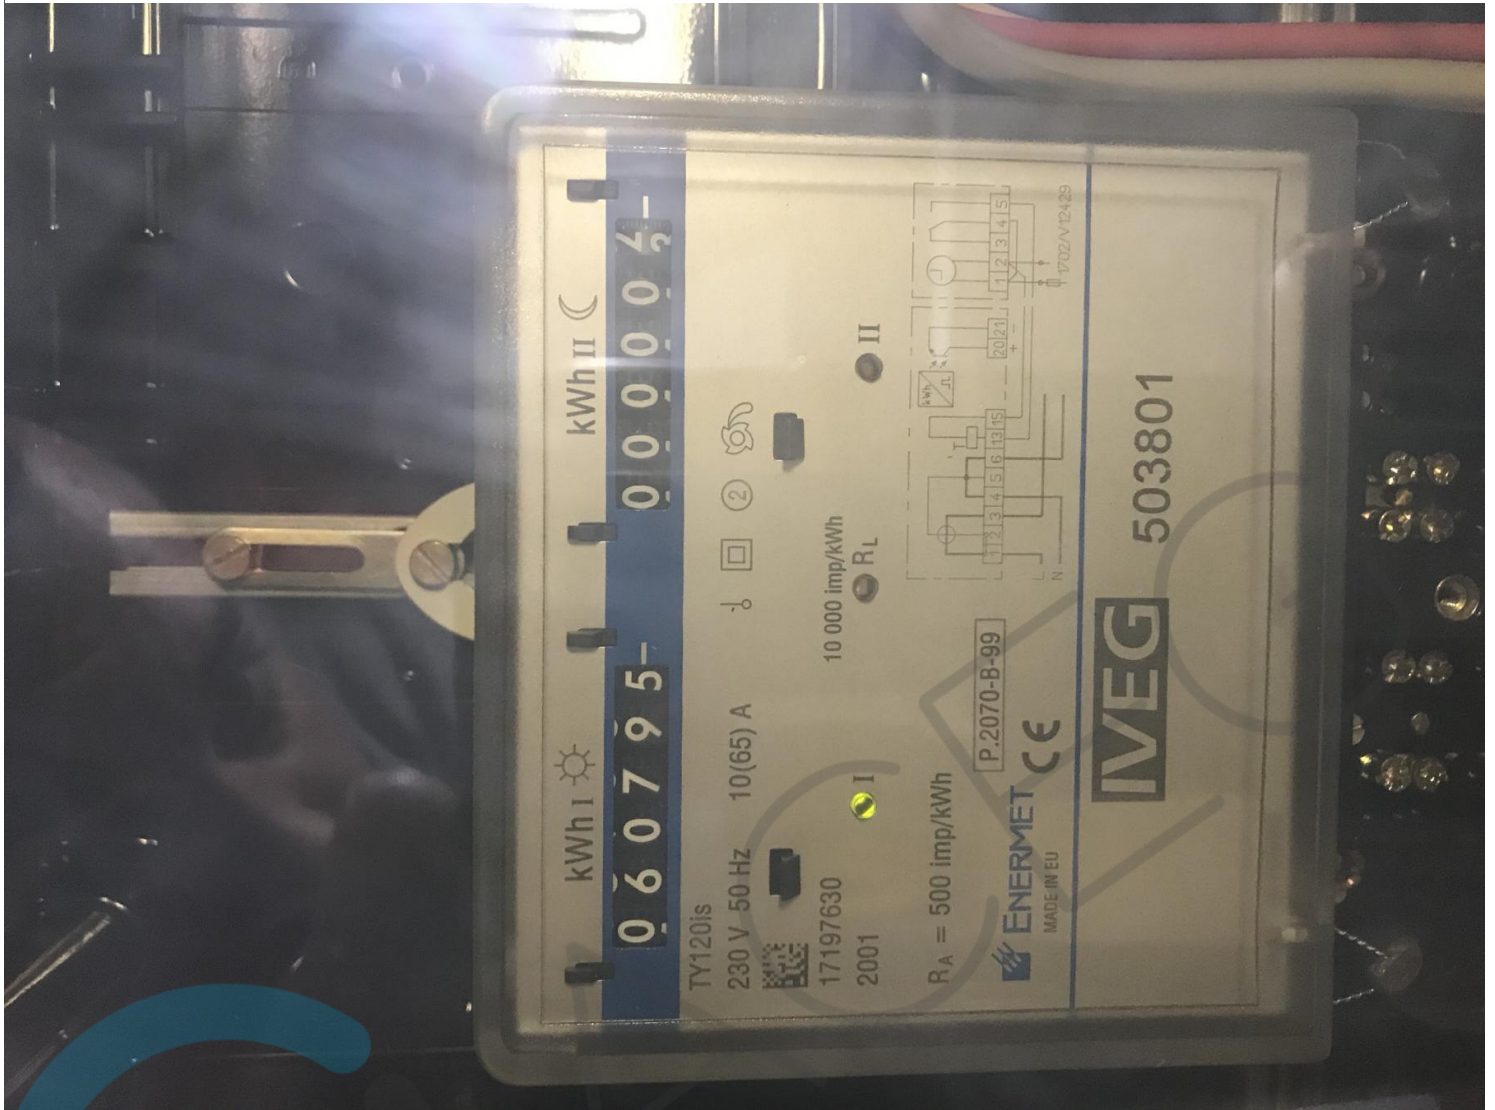

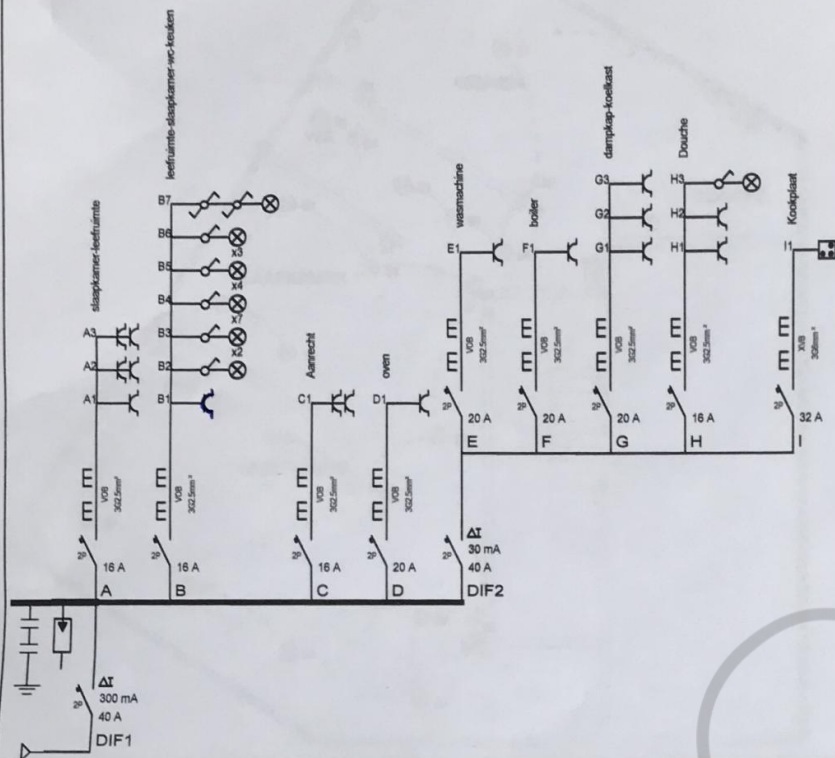

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema1A	mono 230V~
Naam	Fanales	ORGANIS.	Aceg	Naam	Van den Eynde - Cordon Lindelei 76 b1		
BTW	BE 0664-953-311	Naam	Michael Schnurmer	Straat	Lindelei 76 b1		
Datum	27/09/2019	Datum	1/10/2019	Gemeen	2620 Hemiksem		
Handtek	Wim Van den Brande	Handtek	..	Handtek	..		

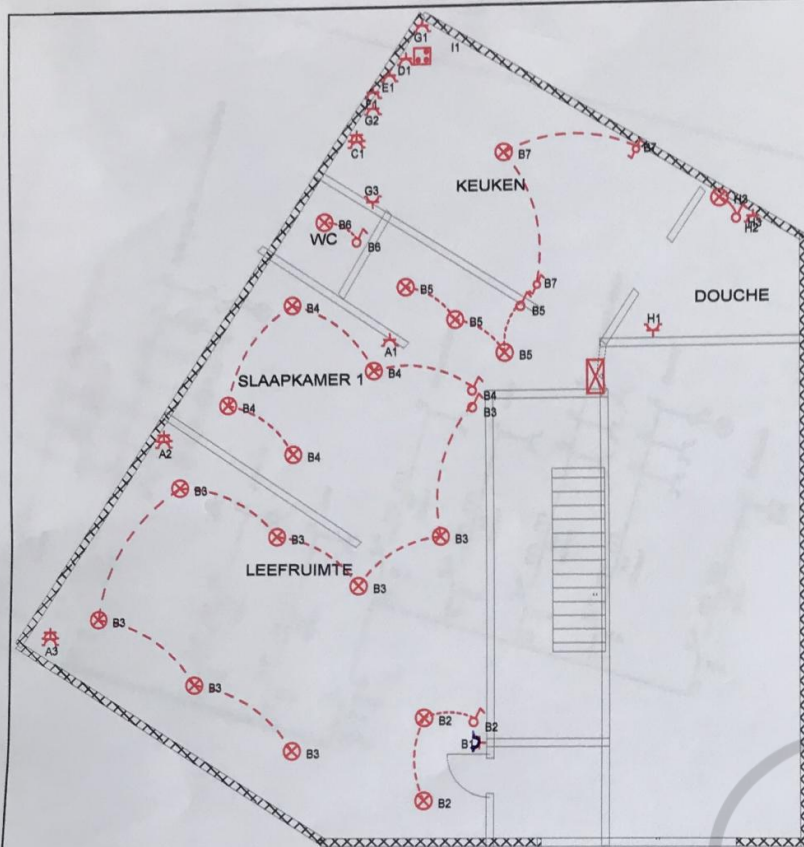

INSTALLATEUR		KEURING	WERF		
Naam	Fanales	ORGANIS.	Aceg	Naam	Van den Eynde - Cordon Lindelei 76 b1
BTW	BE 0664-953-311	Naam	Michael Schnurrer	Straat	Lindelei 76 b1
Datum	27/09/2019	Datum	1/10/2019	Gemeen	2620 Hemiksem
Handtek	Wim Van den Brande	Handtek	..	Handtek	..

