

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 20/05/2026

Inspecteur: Thomas Ceulemans

Mentor:

Installateur: .

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19070723

Datum verslag: 20/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kouterstraat
Huisnummer 90
Busnummer
Postcode 3090
Gemeente OVERIJSE
Land België

Eigenaar

Naam Polares
Straatnaam Onze Lieve Vrouwestraat
Huisnummer 57
Busnummer
Postcode 3020
Gemeente HERENT
Land België

Installateur

Naam .
BTW nr. .
Telefoonnummer .
E-mail .

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54

Teller Nr. : 1SAG3100396053



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 26

Aardelektrode: Horizontaal in de grond ingegraven metalen geleider(s)

Ri algemeen: 1,871 MΩ

RE: 27,9 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	25		2	2,5
1	C	16		2	2,5
1	C	40	Rem	4	10
10	C	16		2	2,5
1	C	16		2	1,5
10	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)

NOK

Directe aanraking

NOK

Indirecte aanraking

OK

Aansluitingen

OK

schema in bijlage door Aceg vzw

NA

Equipotentiale verbindingen

OK

Doorsnede geleiders

NOK

Continuïteit

OK

Verlichting / toestellen

NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

I8.21 Kabeldoorvoeren uit te voeren met wartels of gelijkwaardig bescherming. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 20/5/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:10 tot 10:52

De inspecteur Thomas Ceulemans

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

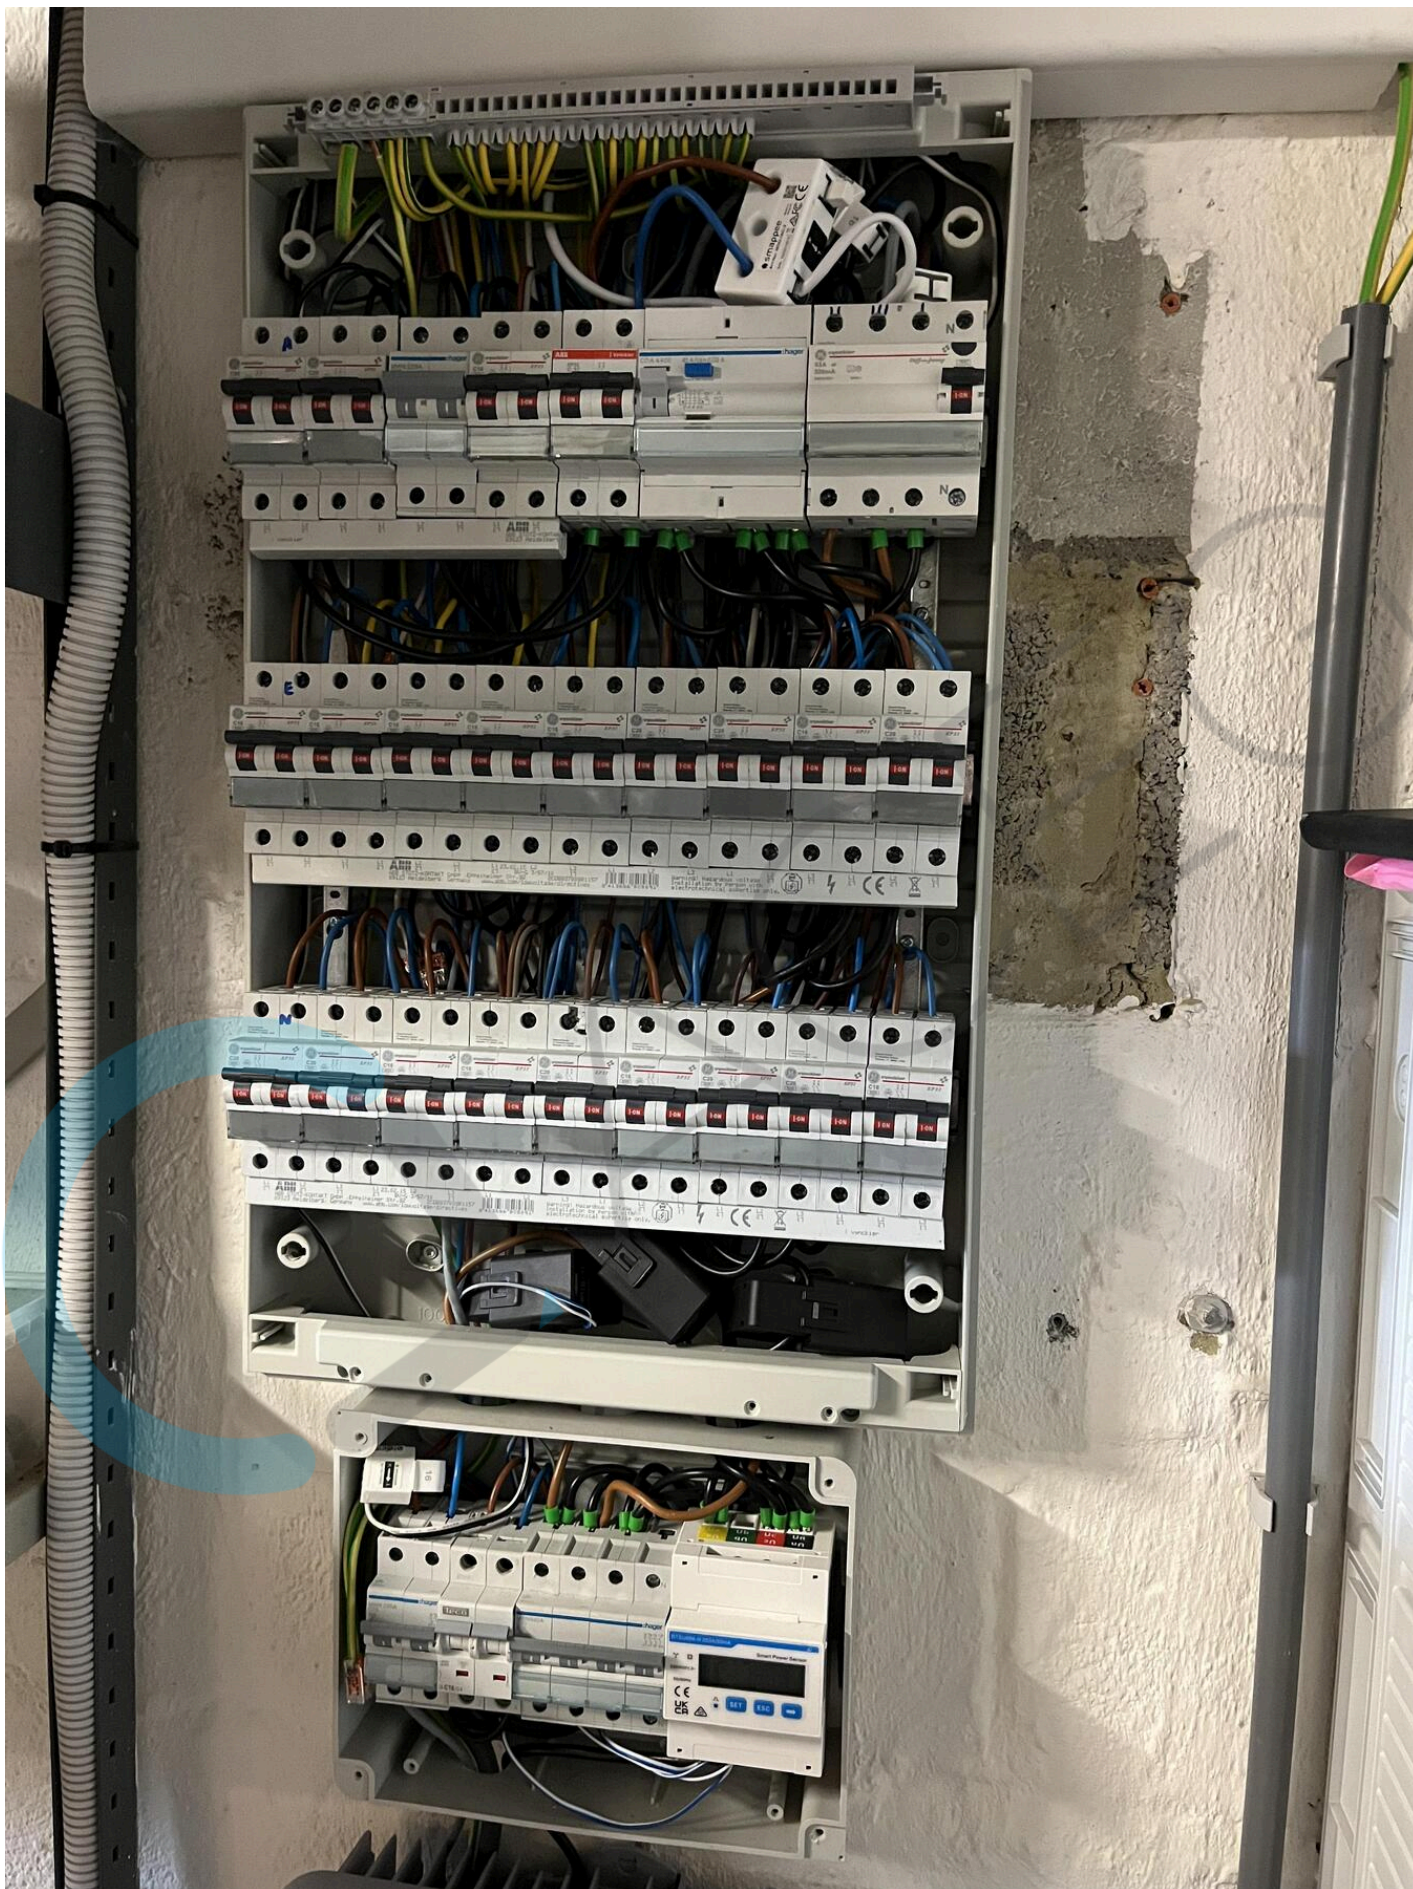











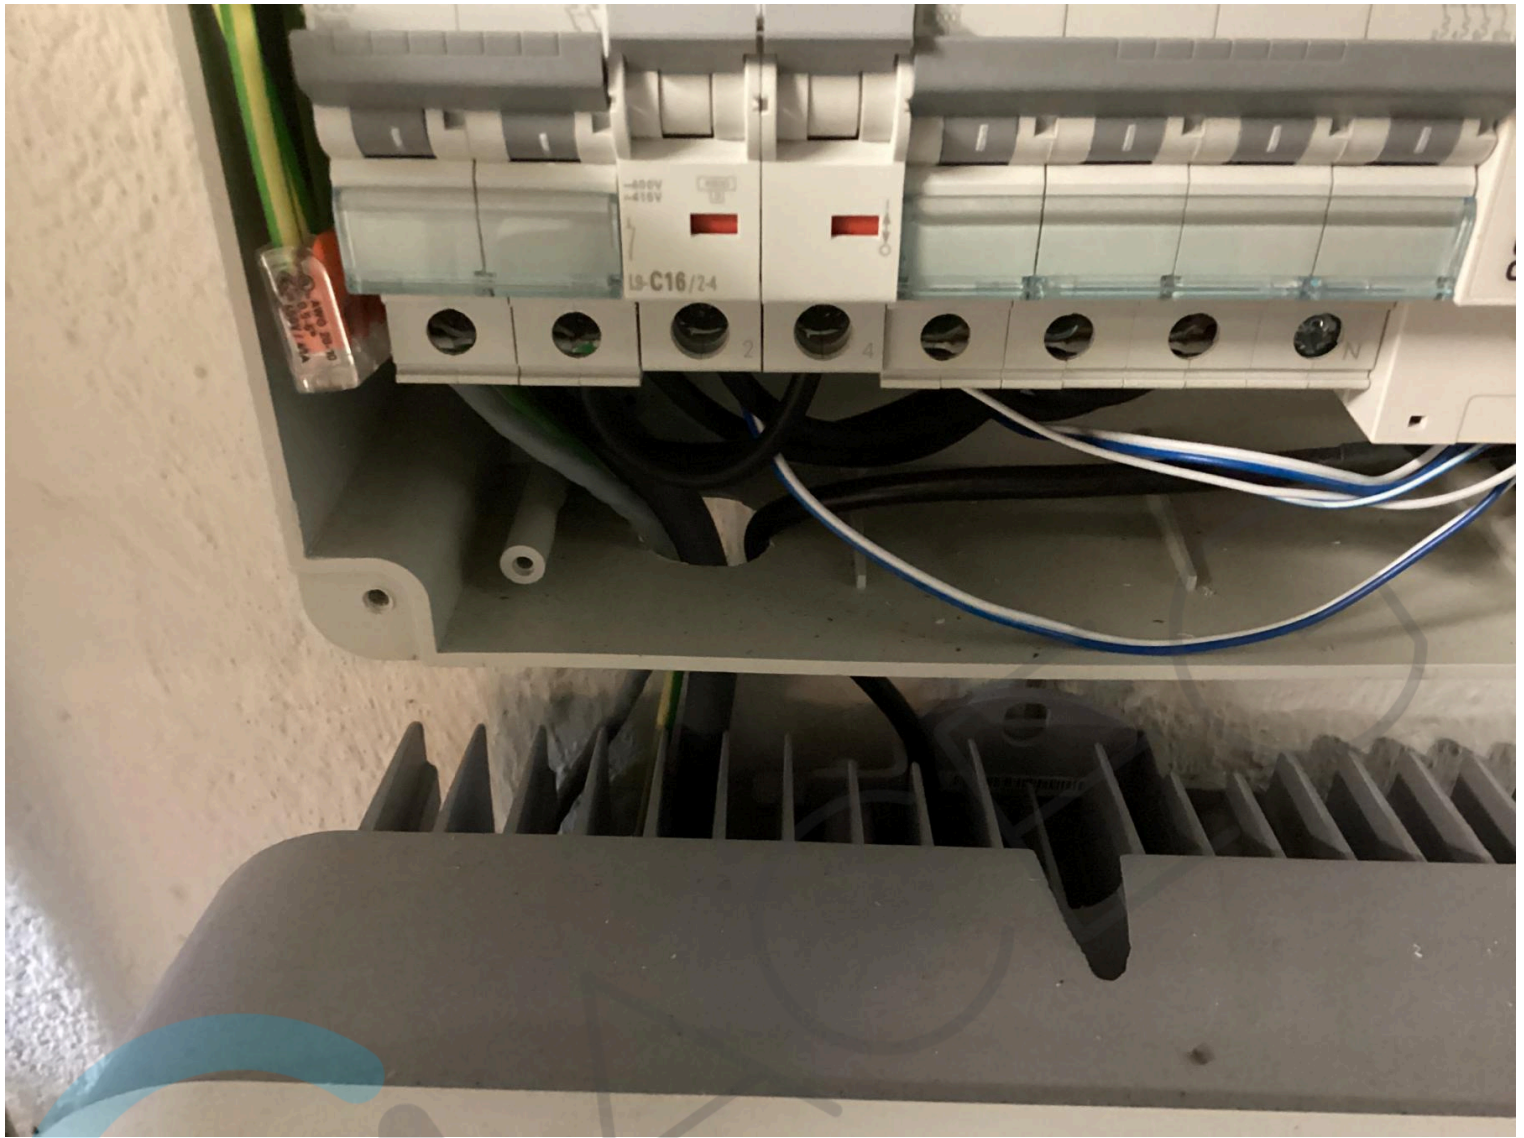

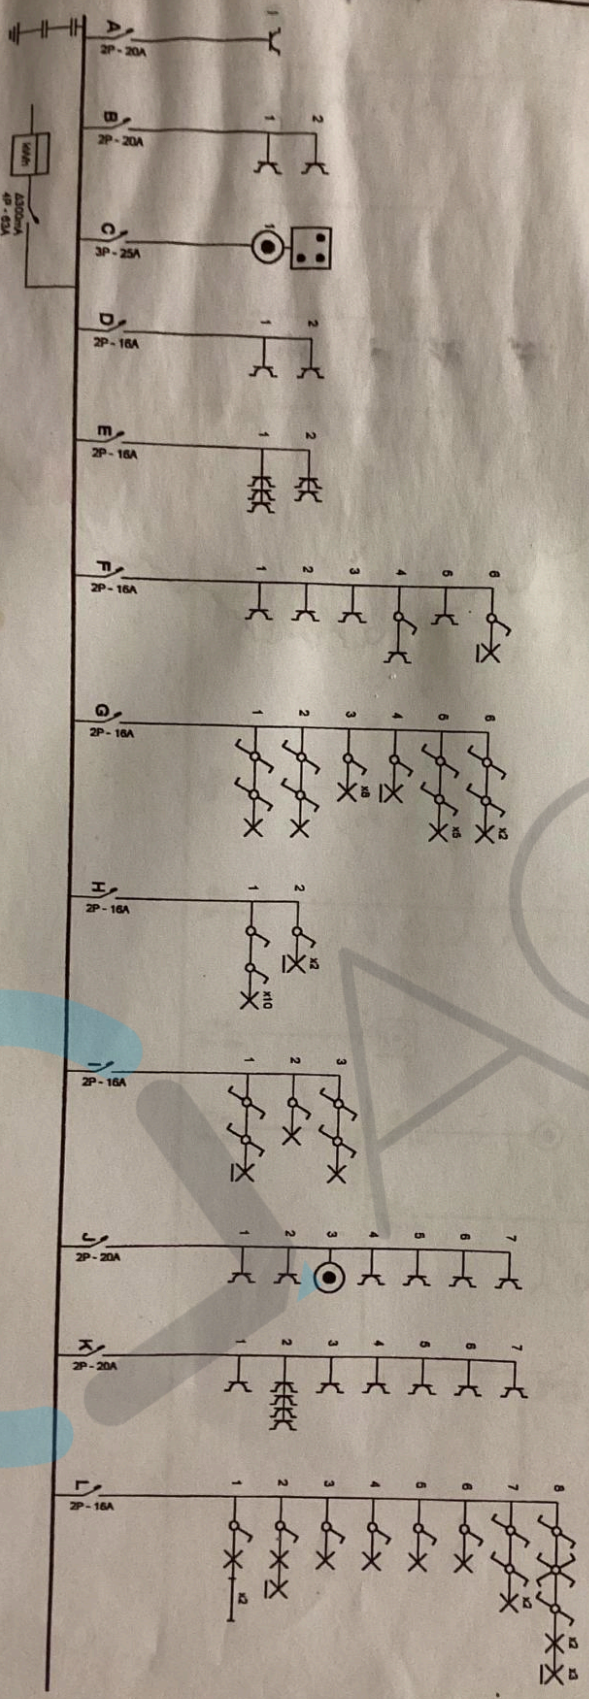

28-05-18


VANCOORTE VZW
 Marnix 11/13
 37188

(Signature)

Plaats van de elektrische installatie
 Dirk Demarre
 Koudestraat 90
 3090 Overfliee

Installateur
 Elektrischewerken Jasper Collin
 Nijverlaan 82
 3090 Overfliee
 GSM: 047 157 40 19
 e-mail: elektriker.jc@gmail.com


p. 1/8
 Eendradschema
 3 x 230V ~ 50Hz

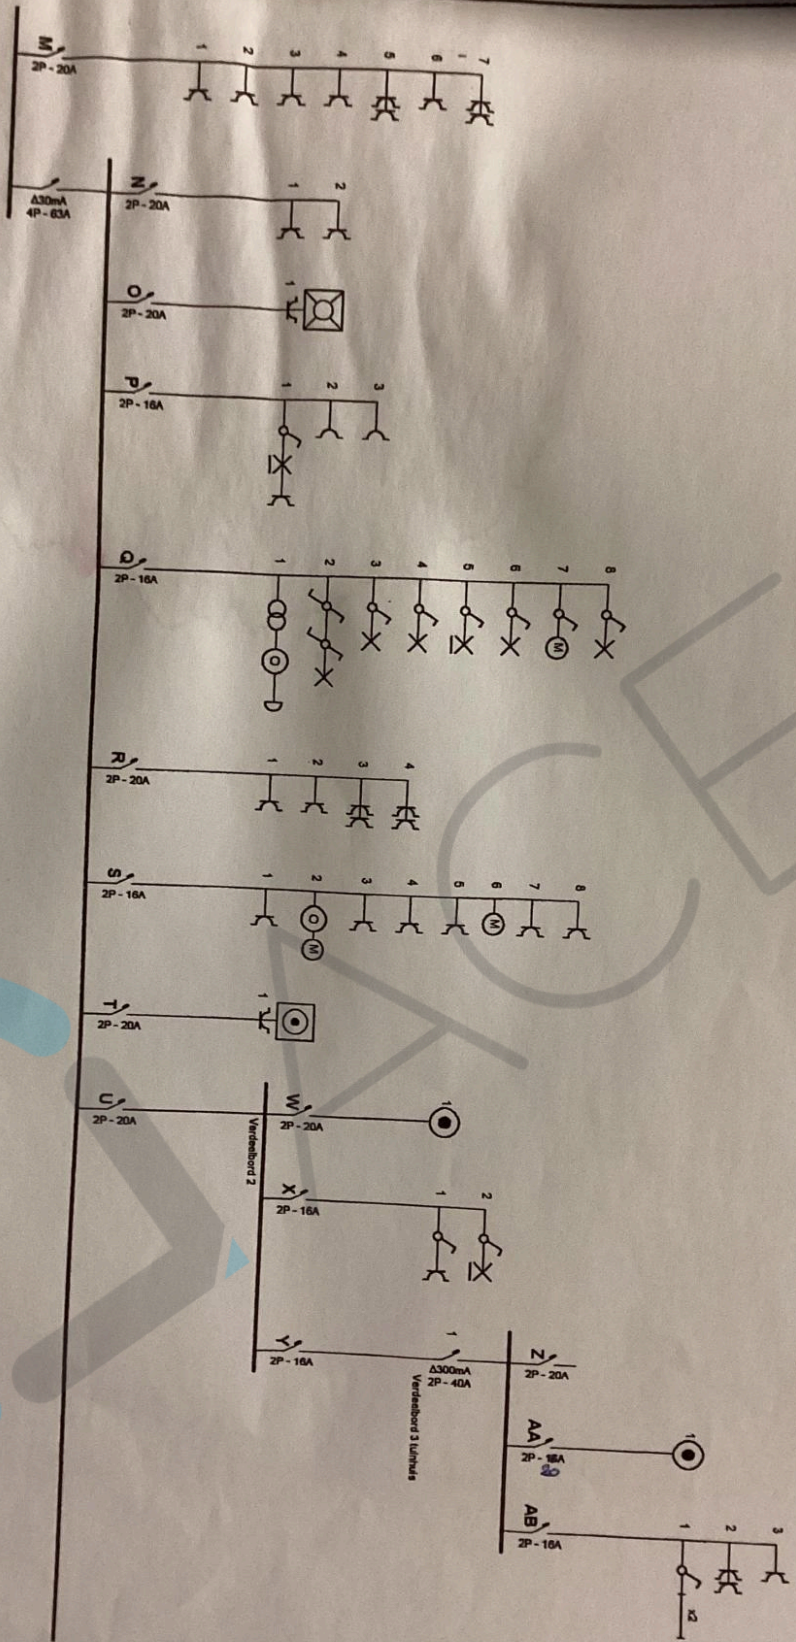

Plaats van de elektrische installatie
 Dijk, Demarre
 Kouterstraat 90
 3090 Overijse

Installateur
 Elektrische werken Jasper Collin
 Nijvelsbaan 82
 3090 Overijse
 GSM: 0471/574019
 e-mail: elektriker.jc@gmail.com

p. 2/8
 Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz





VINQOTTE van
Marco Thys
3788



Plaats van de elektrische installatie
Dijk Damme
Kouterstraat 90
3090 Overijse

Installateur
Elektrische werken Jasper Collin
Nijvelabaan 82
3090 Overijse
GSM: 0471/57 40.19
e-mail: elektriker.jc@gmail.com

p. 3/8
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

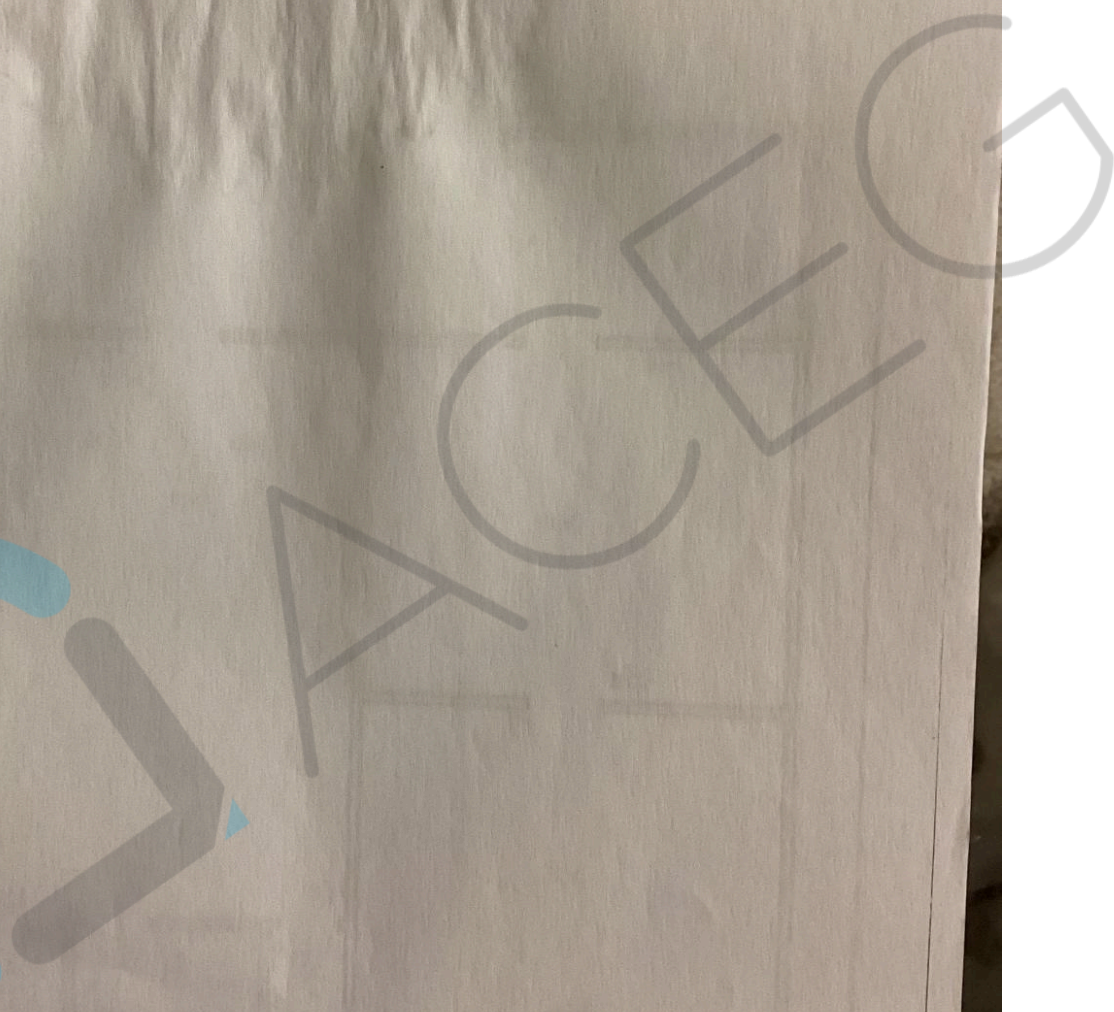





VINCOTTE vzw
Marco Thys
3788

Plaats van de elektrische installatie
Dijk Demarre
Kouterstraat 90
3090 Overfliee

Installateur
Elektricitetwerken Jaaper Collin
Nivelsebaan 82
3090 Overfliee
GSM: 0471/57.40.19
e-mail: elektriker.jc@gmail.com

P. 4/8
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

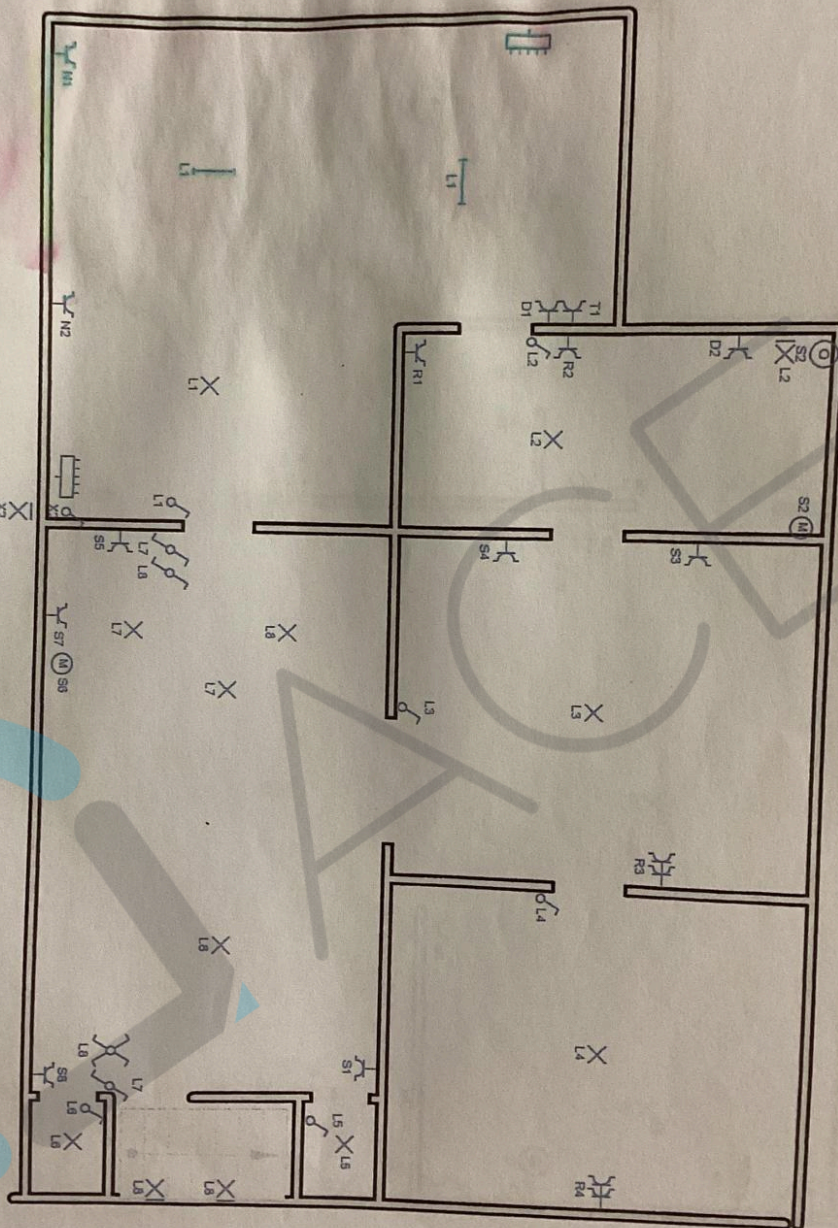


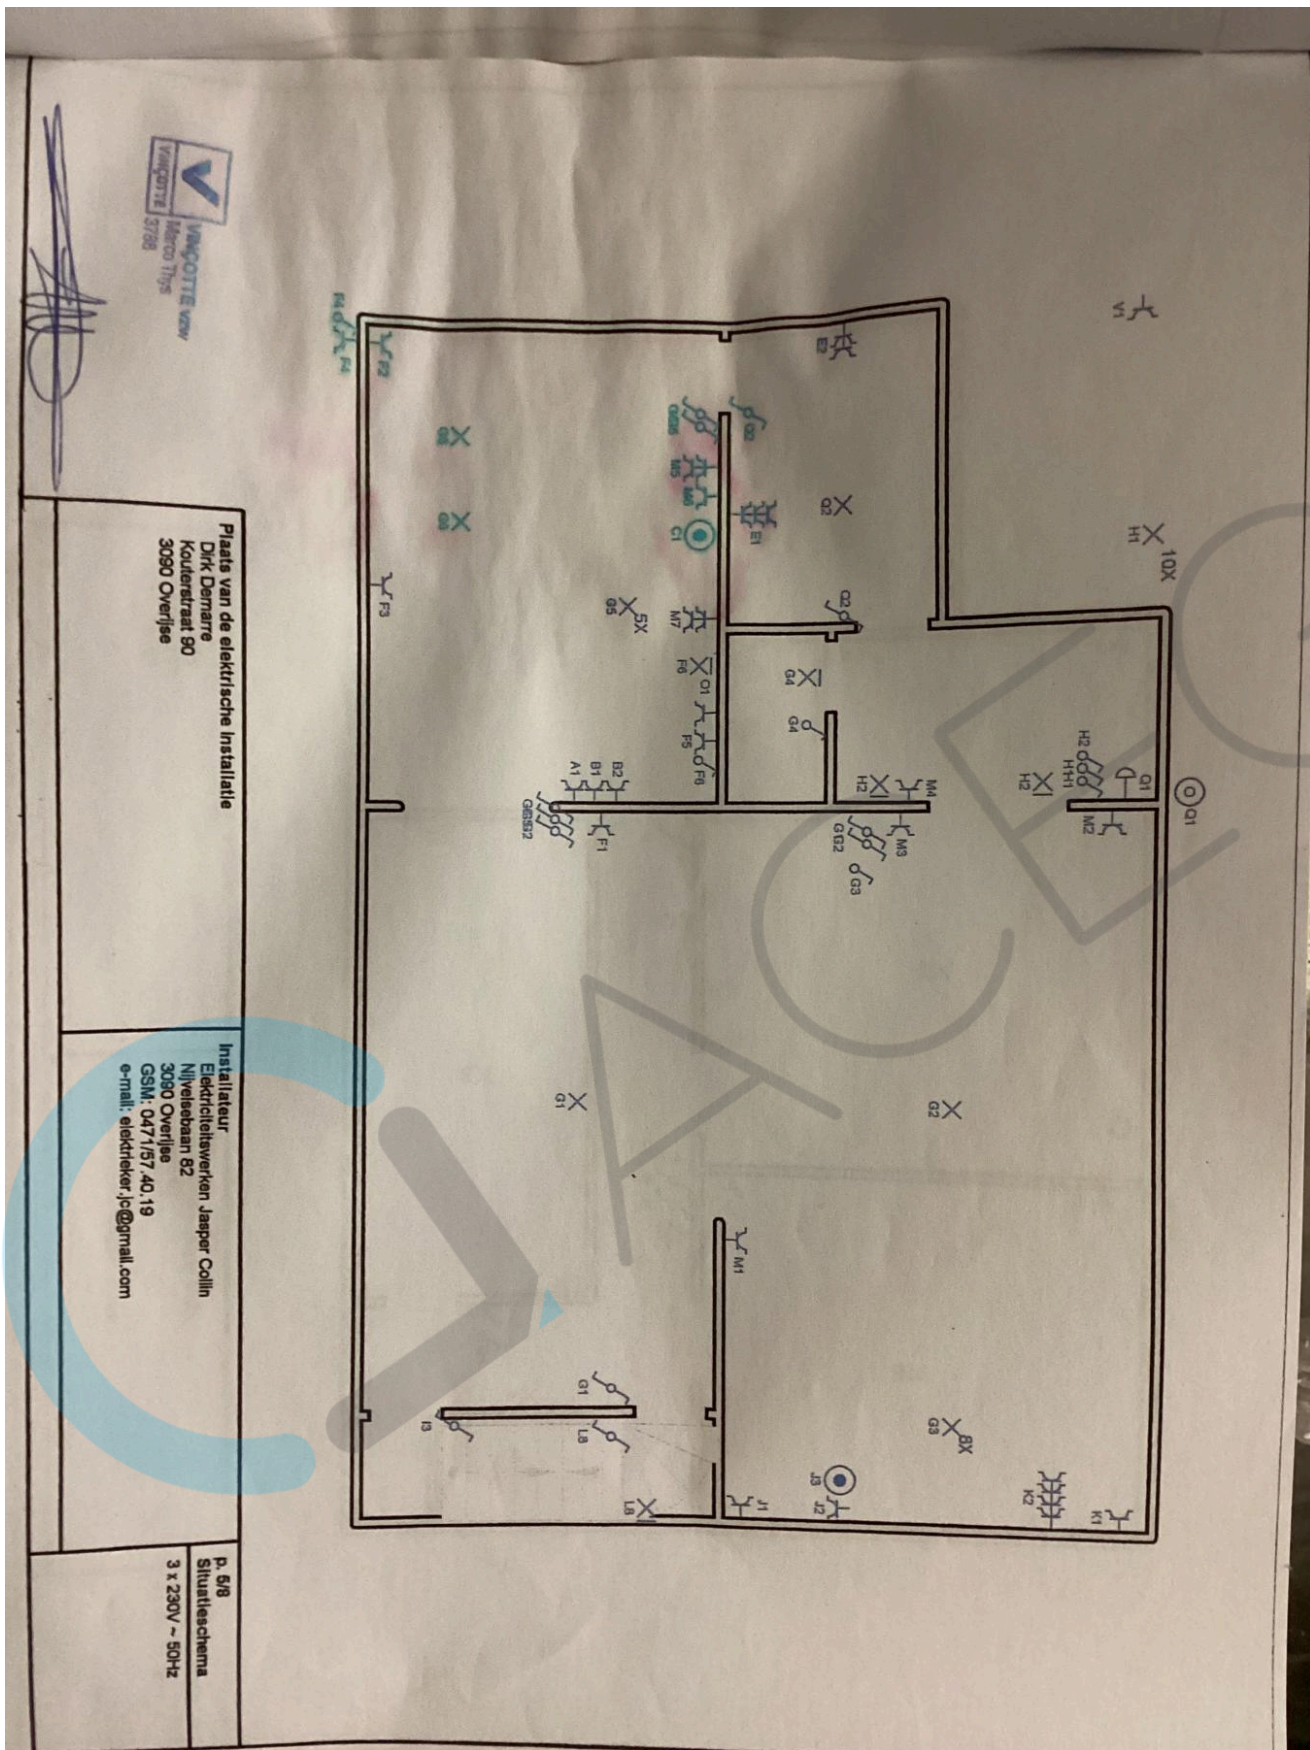

Plaats van de elektrische installatie
 Dirk Demarre
 Kouterstraat 90
 3090 Overijse


Installateur
 Electriciteitswerken Jaap Collin
 Nijvelsbaan 62
 3090 Overijse
 GSM: 0471/57.40.19
 e-mail: elektriker.jc@gmail.com

P. 6/8
Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz

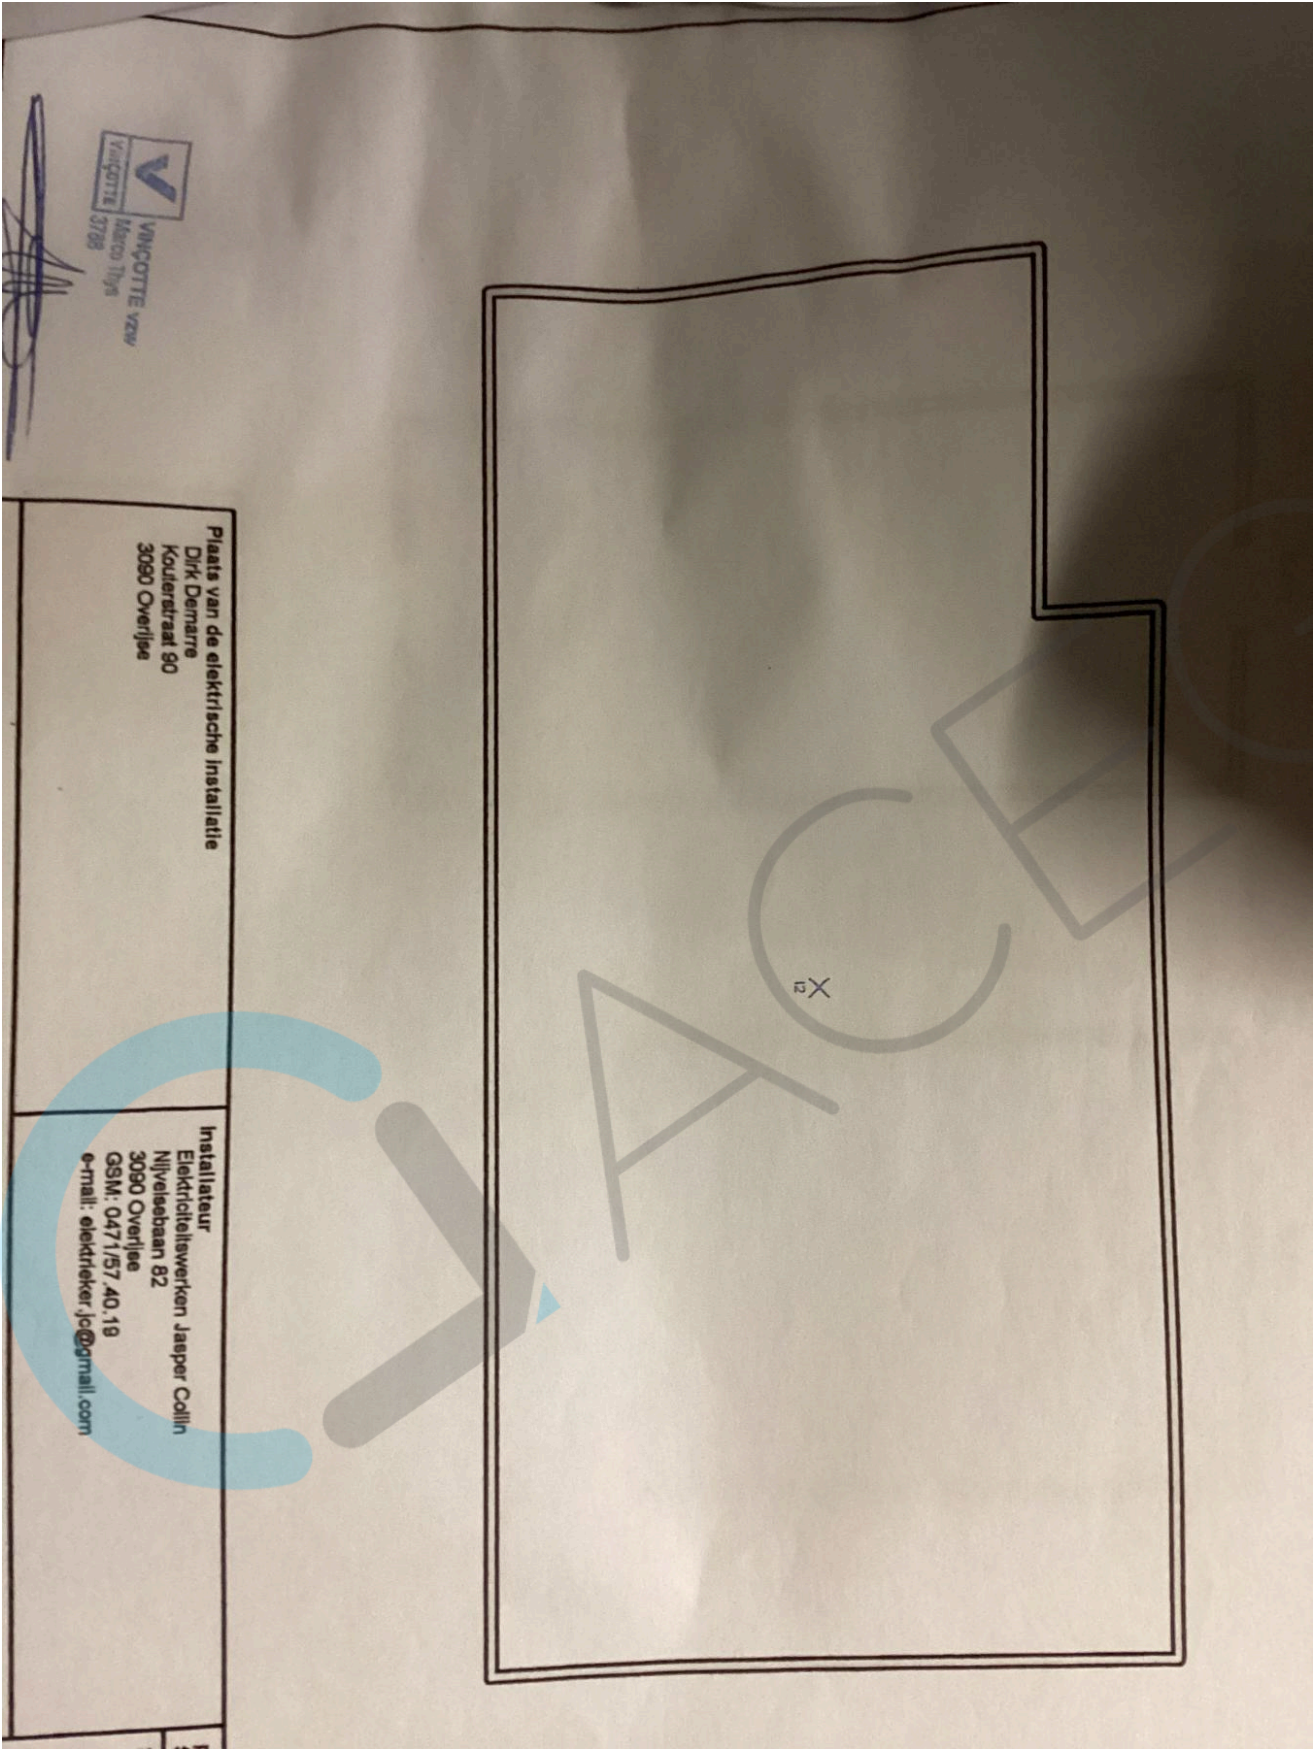

Plaats van de elektrische installatie
Dirk Demarre
Kouterstraat 90
3090 Overijse

Installateur
Elektricitatiewerken Jasper Collin
Nijvelsebaan 82
3090 Overijse
GSM: 0471/57 40 19
e-mail: elektriker.jc@gmail.com

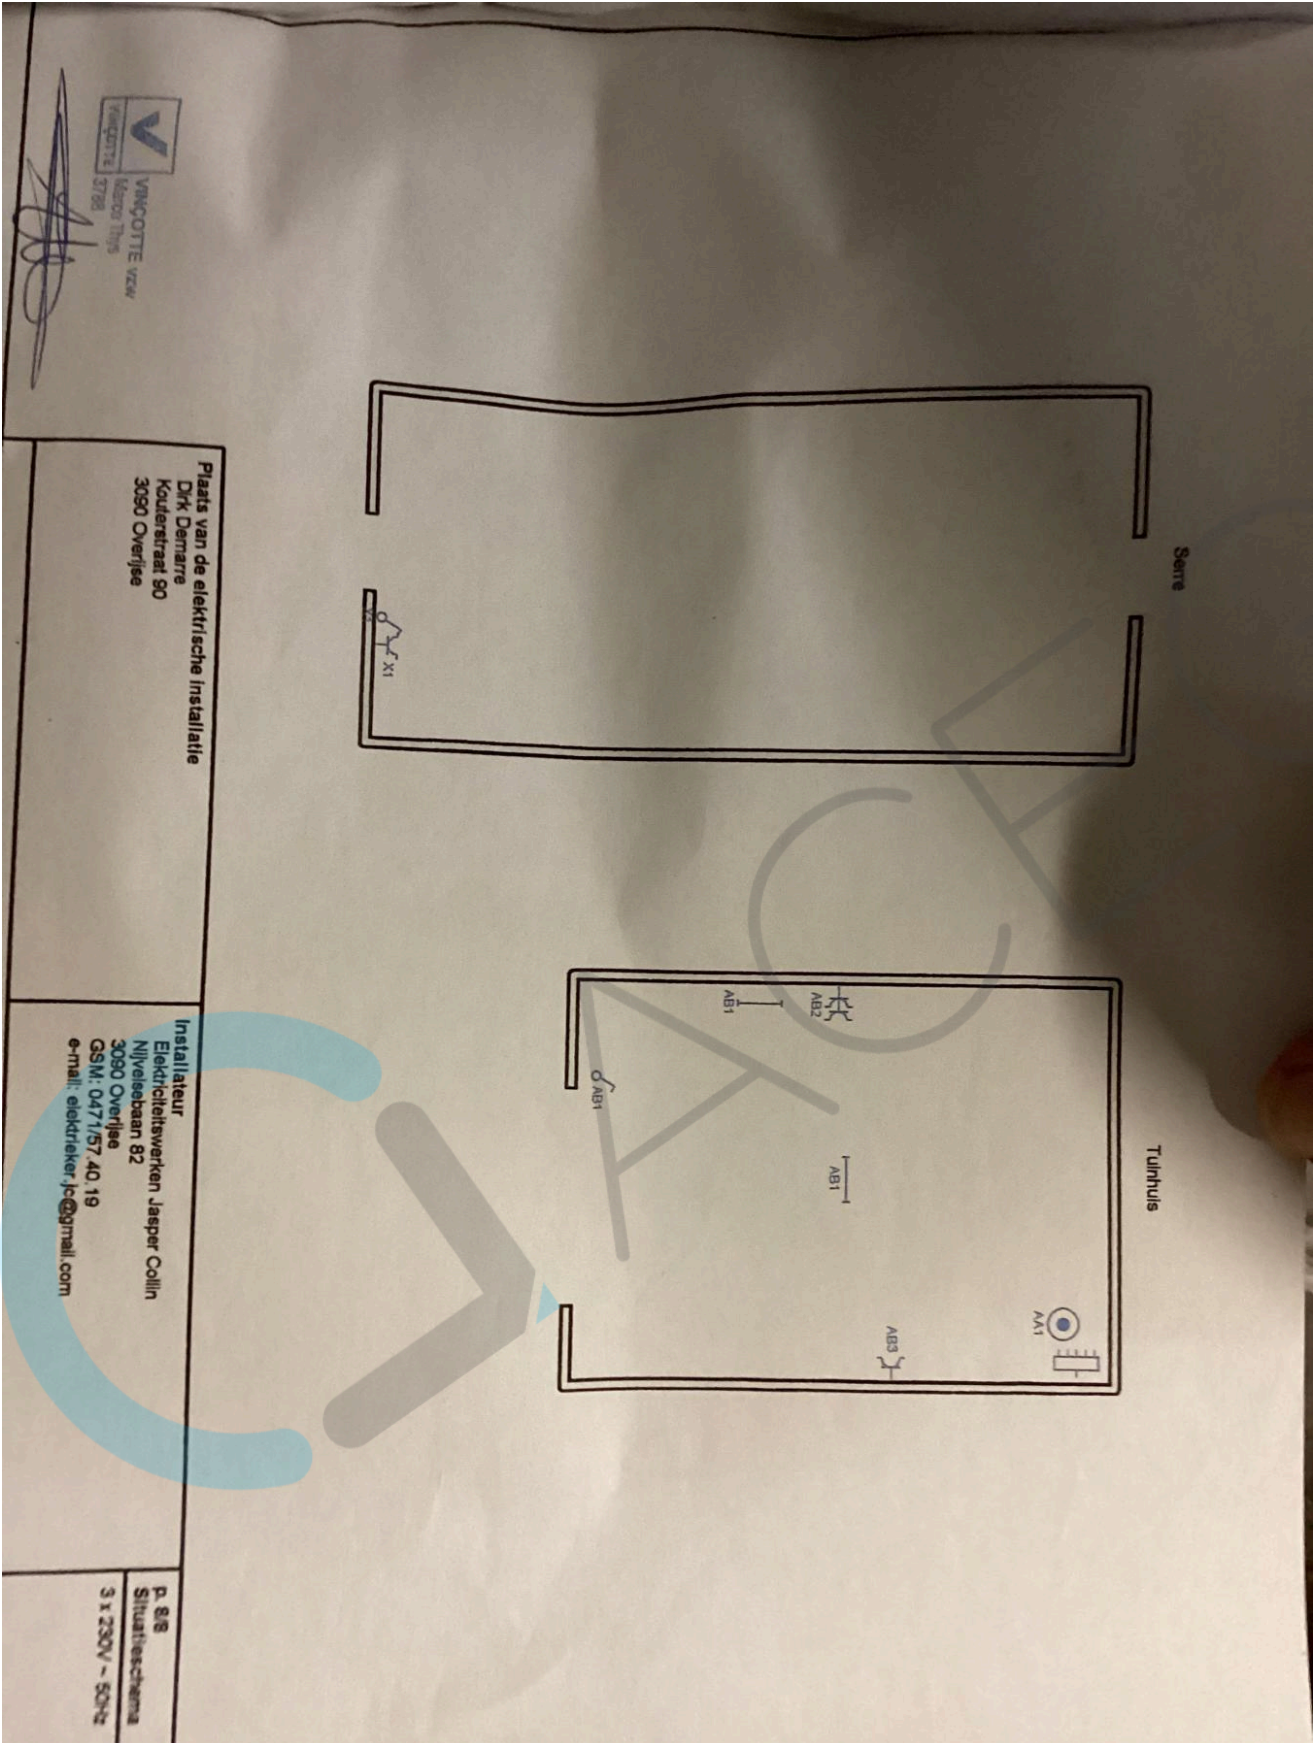


VINGOTTE vzw
 Mator 7195
 3720

Plaats van de elektrische installatie
 Dirk Demarre
 Kouterstraat 90
 3090 Overijse

Installateur
 Elektriciteitswerken Jasper Collin
 Nijvelsbaan 82
 3090 Overijse
 GSM: 0471/57 40 19
 e-mail: elektreker.jc@gmail.com

P. 8/8
 Situatieschema
 3 x 230V - 50Hz



