

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/07/2019 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: Van Den Brande ELEKTRO BVBA  
ID-label: App. Lindelei 76 b2 Client reference: IK. nr.:  
B.T.W. nr.: BE 664 953 311  
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Lindelei  
Huisnummer 76/b2  
Postcode 2620  
Gemeente Hemiksem  
Type appartement

### Eigenaar:

Naam -  
Straatnaam Lindelei  
Huisnummer 76/b2  
Postcode 2620  
Gemeente Hemiksem

EAN : 54

Teller Nr.: : 19255651 (101587)

### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 19 Isolatie: 16,43 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 7,87 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300    | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 22                 | OK   | OK    |
| 30     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 12                 | OK   | OK    |

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| 1              | C     | 32                 |          | 3 | -                         |
| 9              | C     | 20                 |          | 2 | -                         |
| 8              | C     | 16                 |          | 2 | -                         |
| 1              | C     | 6                  |          | 2 | -                         |

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK  
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐  
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting  
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 12/7/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):



**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Michael Schnurrer

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                          | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/7/2044 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |

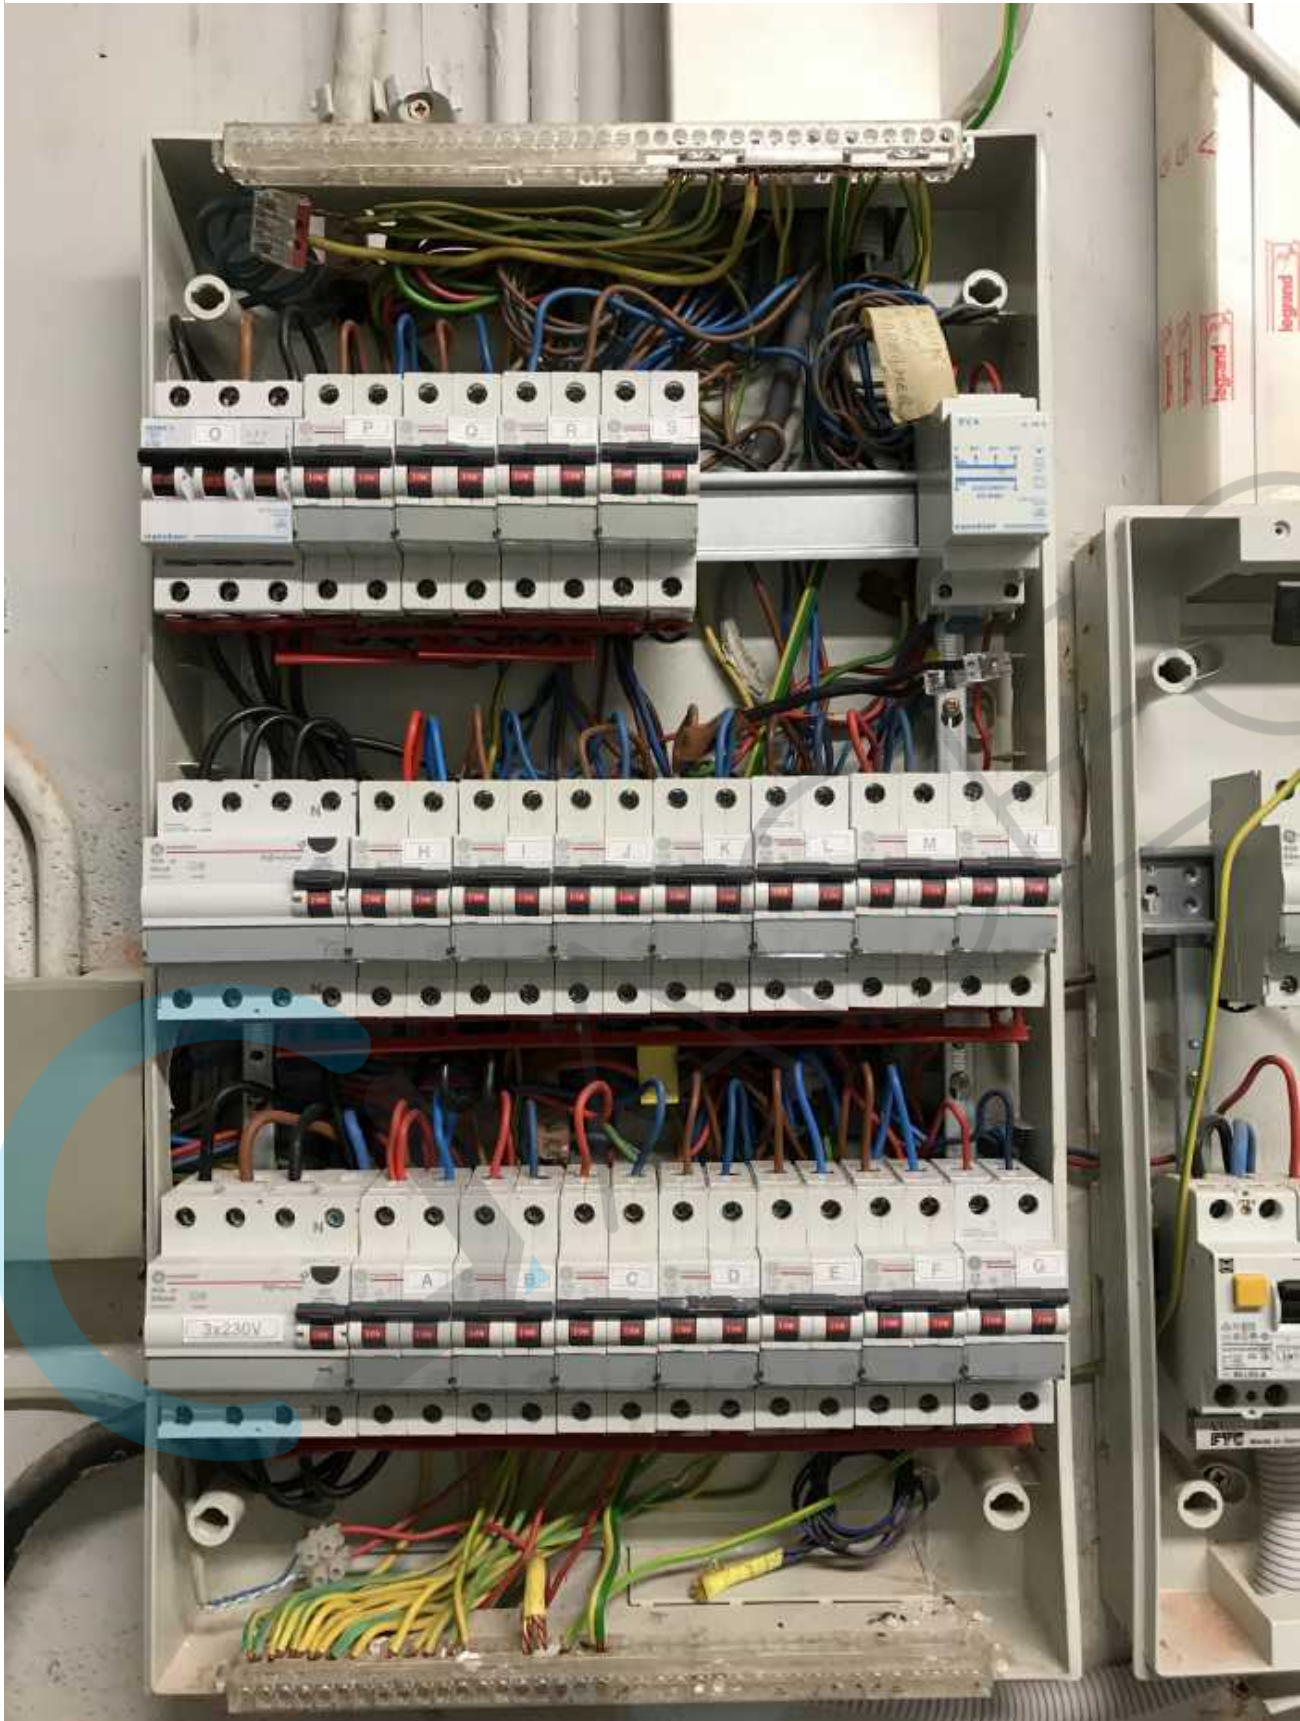

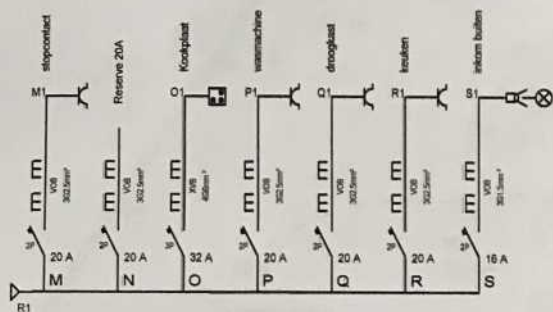

| INSTALLATEUR                                                                                   | KEURING                                                                                                                                                | WERF                                                                                                      | Schema18 | 3 x 230V~ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Naam VoB ELEKTRO bvba<br>BTW BE 0664-653-311<br>Datum 07/07/2019<br>Handtek Wim Van den Brande | ORGANIS. Aceg<br>Naam Michael Schnur<br>Datum 12/7/2019<br>Handtek  | Naam Van den Eynde - Cordon Lindelei 76 b1<br>Straat Lindelei 76 b2<br>Gemeen 2620 Hemiksem<br>Handtek -- | Schema18 | 3 x 230V~ |

